




9

# REPORTE MENSUAL

**millennia.** |

AVANCE DE OBRA  
Mayo 2023

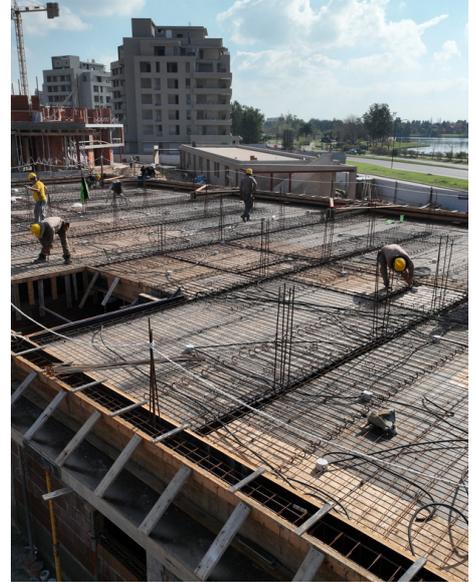


## Avance de trabajos de obra

Llenado de loza primer piso módulo B.



### MODULO A

- Se completa la colocación de cañeros de los circuitos de termostatos de las losas radiantes.
- Se avanzó con las instalaciones sanitarias en baños y cocinas.
- Montaje de parrilla en UF 104.
- Continúa la elevación de mamposterías interiores con huecos del 12 y huecos del 8.
- Continúa el desencofrado de fenólicos.
- Finaliza la elevación de mampostería portante del 18 en 2do piso.
- Comienza a realizarse la colada de hormigón de columnas y continúa el doblado de hierros para armaduras de vigas transversales y perimetrales.

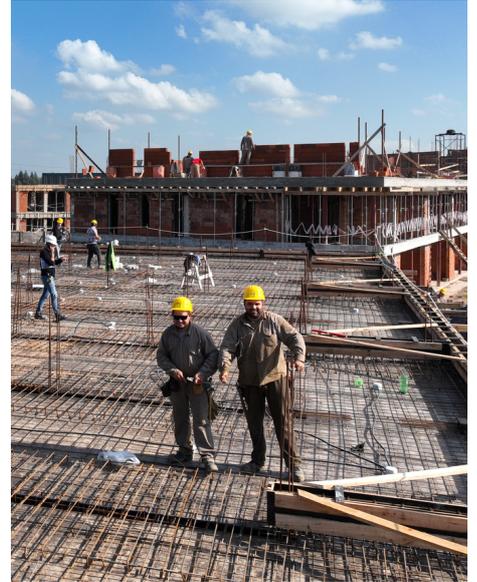

### MODULO B

- Instalación de cajas de puntos de iluminación y tomacorrientes.
- Finaliza el armado de escaleras, el tendido de armaduras de losa y refuerzos, colocación de pases e instalaciones eléctricas.
- Se deja preparado para Hormigón de losa.

### MODULO C

- Concluye la colocación de fenólicos y se realiza el cierre exterior de viga perimetral.
- Se colocan las armaduras de ménsulas, vigas transversales y perimetrales.
- Se comienza con los trabajos de electricidad para colocar las



# Imágenes

bocas de iluminación.

- Comienza el tendido de hierros de la armadura inferior de losa.

## MODULO D


- Se terminó la colocación de piso radiante eléctrico.
- Se comenzó con los trabajos de yesería.

## S.U.M.

- Se hormigona la losa.



# Imágenes

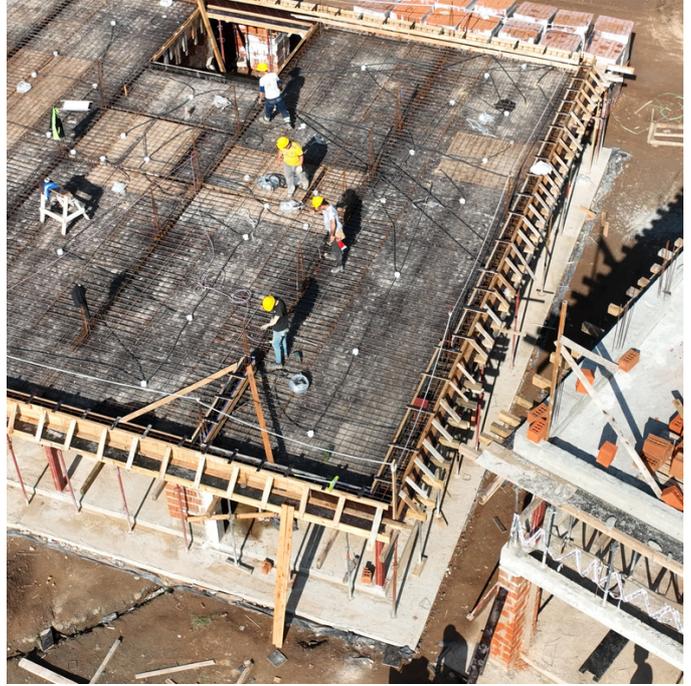

**millennia.**

Reporte mensual de avance de obra.
