



11

REPORTE MENSUAL

millennia. |

AVANCE DE OBRA
Julio 2023




Avance de trabajos de obra

Se comenzaron los trabajos sobre Modulo E.




MODULO A

- Se continúa con armado de parrillas en PB.
- Se termina con carpeta hidrofuga para instalación del cableado de losa radiante en PB.
- Se termina con la pre instalación de equipos de aire en PB.
- Se continúa con la colocación de bocas de puntos de iluminación y tomacorrientes.
- Se termina armado de losa de 2do piso.
- Se continúa con el recuadre de vanos interiores.
- Realiza la preinstalación de equipos de aire en 1er piso.
- En la azotea se preparan las columnas con perfiles UPN 140 para el armado de la pérgola

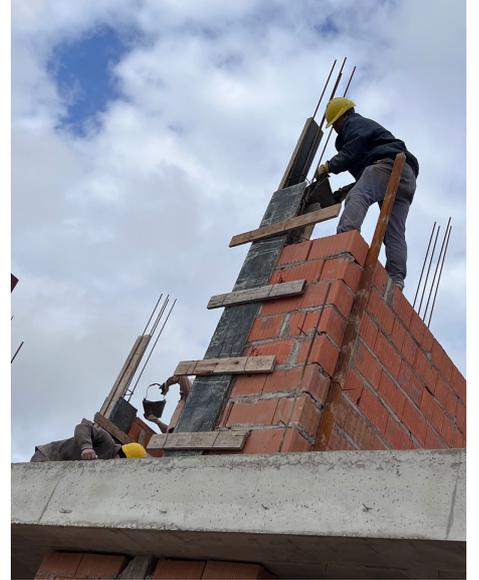

MODULO B

- Se continuó con el ajuste de vanos interiores y faltantes de mamposterías.
- Se continúa realizando las instalaciones de provisión de agua fría y caliente.
- Se realiza el recuadre de vanos perimetrales y se comienza a trabajar con recuadre de vanos interiores
- Se avanza con el armado de la losa colocando las armaduras de vigas transversales.
- Se han montado los encofrados exteriores de vigas perimetrales y comenzado a colocar la armadura inferior de losa.

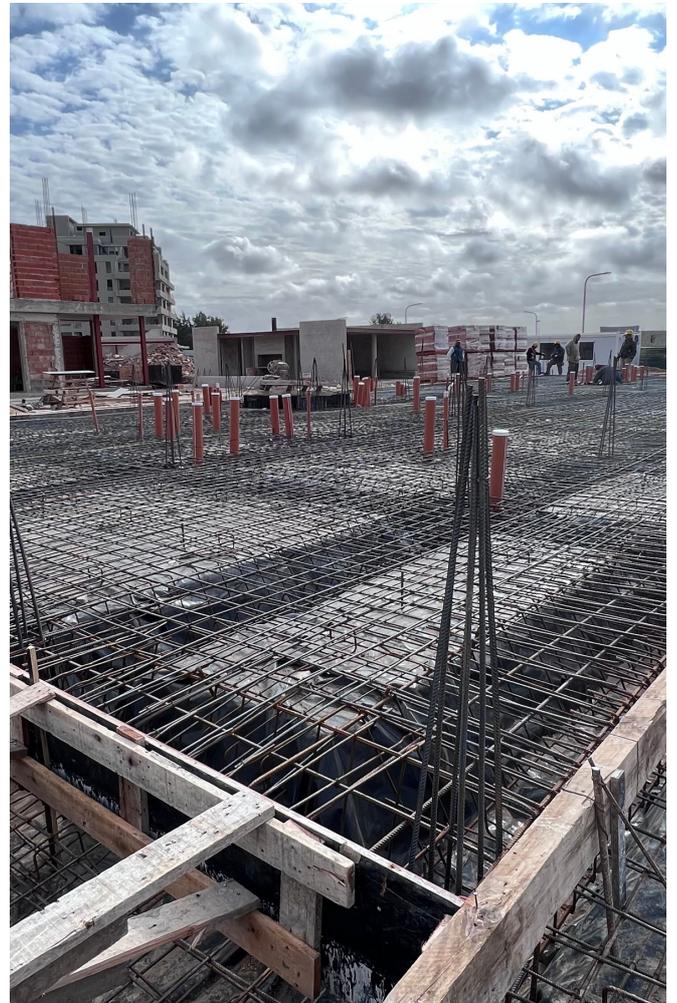

Imágenes

MODULO C

- Se realizó la platea de hormigón
- Se realizó el apuntalamiento de la losa para el primer piso.
- Comienza la elevación de mamposterías portantes del 18.
- Se realizó la platea de hormigón
- Se realizó el apuntalamiento de la losa para el primer piso.
- Comienza la elevación de mamposterías portantes del 18.

MODULO D

- Colocan los módulos de medidores
- Comienza el armado del cantero agregado en la azotea



Imágenes



MODULO E

- Armado armadura de hierro.
- Se continuó con la colocación del piso.
- Se continua con el montaje de la armadura de la platea.

SUM

- Realiza el contrapiso y carpetas en toda la PB.
- Completa revoques
- Se termina armado de parrilla
- Colocación de bocas de tomas e iluminación en bancos.



Imágenes

