


12

# REPORTE MENSUAL

**millennia.**

AVANCE DE OBRA  
Agosto 2023

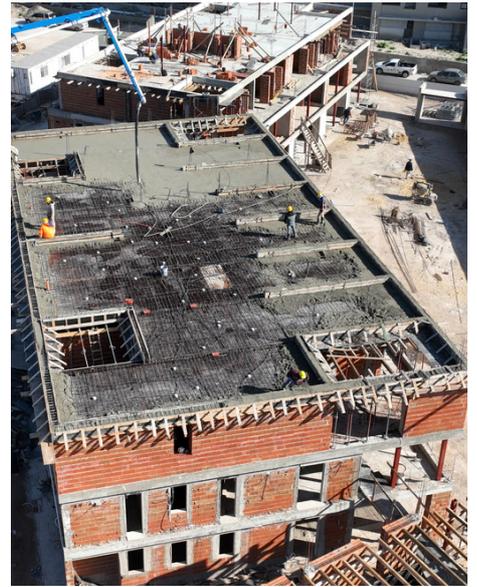


## Avance de trabajos de obra



### MODULO A


- Revoque y recuadre de viga perimetral e interiores.
- Cierre de mochetas de plenos en baños y cocinas.
- Ejecución de carpeta hidrofuga en galerías y en Hall de accesos al 1P.
- Instalaciones de circuitos de puntos de iluminación y cajas de toma corrientes.
- Revoque de laterales y colocación de pre-moldeados de parrillas.
- Instalación de provisión de agua fría y caliente en baños y cocinas de piso 1.
- Se continúa con mampostería interior con huecos del 12 y 8. Comienzan a recuadrar vanos interiores.

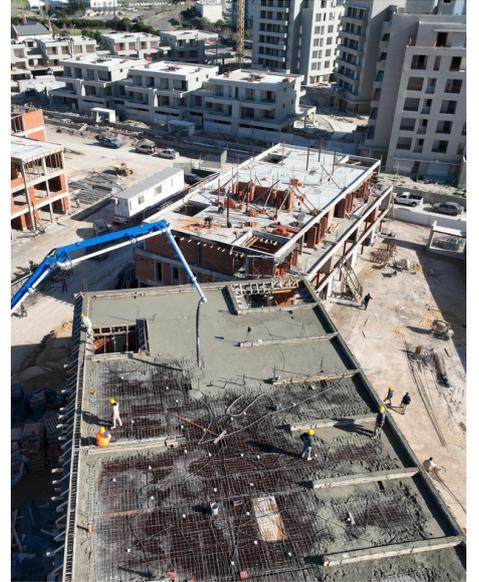

- Revoque de fachadas.
- Colocación de caños de cloacas y de aguas en baños.
- Montaje de perfiles IPN para estructura soporte de tanques y elevación de mamposterías que conforman las parrillas.

### **MODULO B**

- Se realiza la carpeta hidrofuga interior y se extiende hasta las galerías.
- Recuadro todos los vanos interiores. Instalación de circuitos de iluminación y tomacorrientes.
- La losa continua apuntalada.
- Replanteo de mamposterías.
- Izaje de perfiles para estructura soporte de tanques y escaleras caracol.

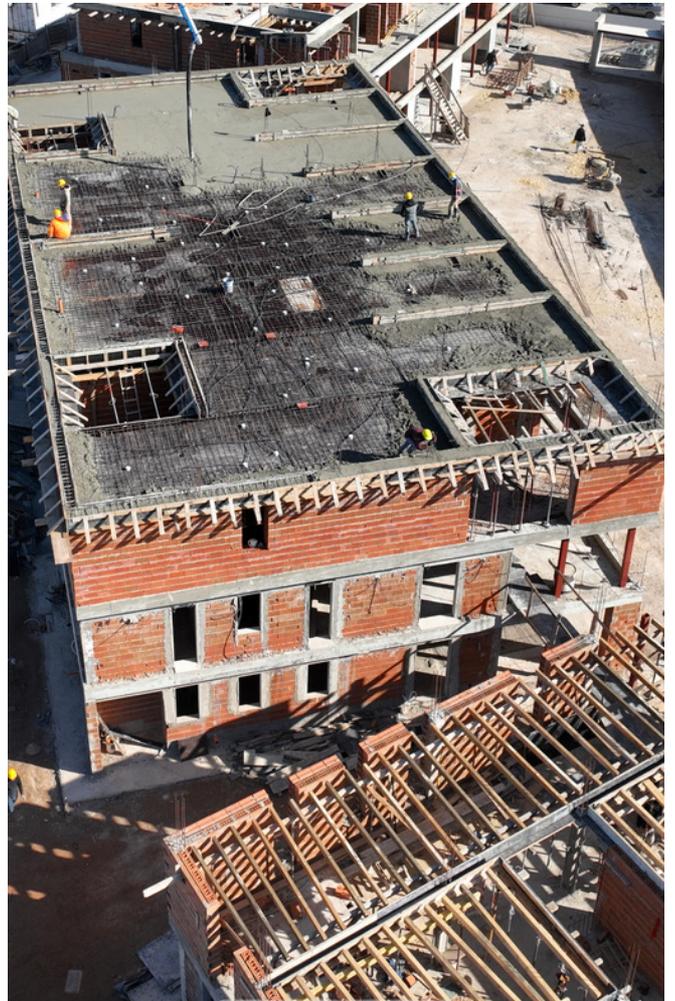


# Imágenes

## MODULO C

- Se completó armado de losa y 6 escaleras interiores y se lleva a cabo la colada de hormigón de dicha losa.
- Se completan las instalaciones de los circuitos de iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado y TV.

## MODULO D

- Colocación de aberturas en todas las unidades
- Finalizado colocación de revestimientos en pisos y baños.
- Comienza colocación de revestimiento en el Laundry.

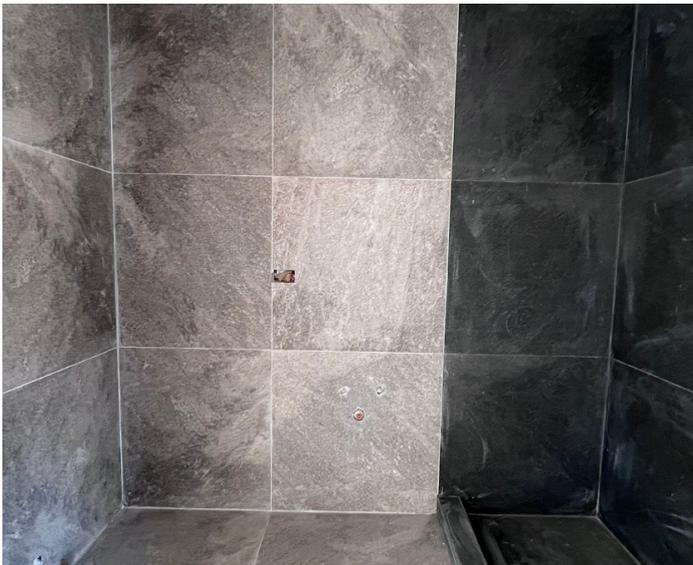

# Imágenes



## MODULO E

- Completan la elevación de mamposterías portantes del 12 y 18.
- Se realiza el encofrado de vigas de encadenado.
- Comienza el montaje de puntales y tirantes para armado de encofrado de losa.

## SUM

- Sin avances.



# Imágenes

