



17

REPORTE MENSUAL

milennia.

AVANCE DE OBRA
Enero 2024



Avance de trabajos de obra

Comenzó la colocación de aberturas



MODULO A

- Se continuo con la colocación de pisos en la galería de la UF 101
- Se continuo con los ajustes de los revoques en yeso.
- Se comenzo con la instalación de aberturas.
- Comienza el armado de la estructura de cielorrasos en baños y cocinas de las 6 UF
- Se completa la colocación de pisos en la UF 205 – Zócalos al 90% a la espera de colocación de aberturas.

MODULO B

- Armado y recuadro de bateas pluviales.
- Recuadro de dinteles de puertas exteriores en UF 101, 102 y 103
- Colocación de pisos en galería de la UF 106, 105 y 104



- Comienzan los ajustes de los revoques en yeso.
- Se comienza con la instalación de ventanas
- Se realiza la colada de banquetas bajo parrillas faltantes.
- Se continúa con revoques en yeso en pasos de escalera.
- Se continúa con las banquetas de cocina en las 6 UF y revoques de yeso en las UF 204 y 205



MODULO C

- Se comienza con el armado de bateas pluviales.
- Comienza el armado de parrillas.
- Se alinean mamposterías de cierre lateral de parrilla.
- Se completa el recuadro de viga perimetral en fachada.

- Se realiza la colada de banquetas bajo parrillas faltantes.
- Se continúa con revoques en yeso en pasos de escalera.
- Se continúa con las banquetas de cocina en las 6 UF y revoques de yeso en las UF 204 y 205

MODULO D

- Se realizan las bases de hormigón para cámaras eléctricas y la colada de losas de tanques de agua.

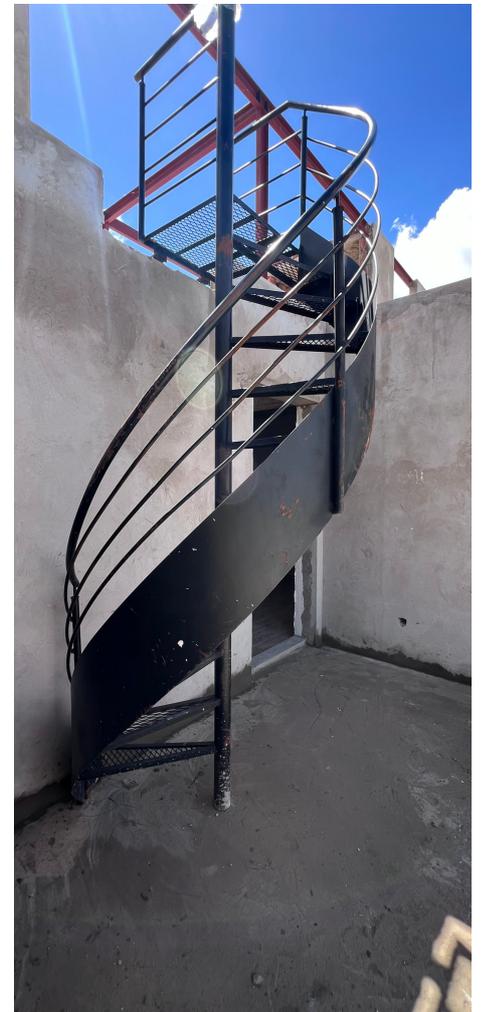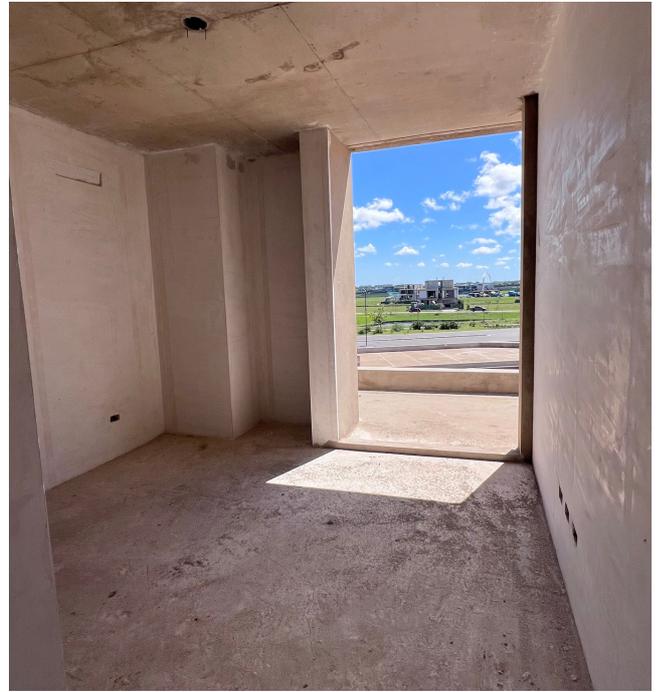



MODULO E

- Se completa el desencofrado de losa.
 - Se realiza el replanteo de mamposterías interiores.
 - Se realiza el encofrado de escalera y se colocan pases pluviales en ménsulas.
- Instalación de cajas de iluminación exterior.

SUM

- Se realiza la mesada de hormigón en baño.

