



16

REPORTE MENSUAL

millennia. |

AVANCE DE OBRA
Diciembre 2023



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Se comenzó con la colocación de cuadros de ducha.
- Se ajusto revoque en toilette UF 106 para aplicación de revestimiento.
- Realiza los zócalos de cierre de box de ducha en los baños de las UF 101, 102, 103 y 104.
- Se realiza mesada de vanitory en hormigón en Toilette UF 101.
- Se recuadra escalera interna en UF 201
- Se aplica pintura base en vanos de ventanas para la instalación de aberturas.
- Se completa el muro de carga (para contención de agua) en las habitaciones hacia balcones de todas las UF.




MODULO B

- Se continua con los revoques en baños, cocinas y buñas de todo el módulo.
- Se empieza a proyectar yeso en el 2do piso
- En azotea se comienza a realizar planchada con hidrofugo, a la fecha esta realizado al 50%.

General

- Tendido de red cloacal.
- Armado de cámaras circulares.
- Ejecución de desagües pluviales de módulos C y E.
- Se realizo salida pluvial a cordón de tendido modulo A y D (sector SUM)
- Se colocaron mangueras de agua para tanques de bombeo de módulos C y E.
- Se realizo la zanja para cañería pluvial en jardines privados de modulo E.

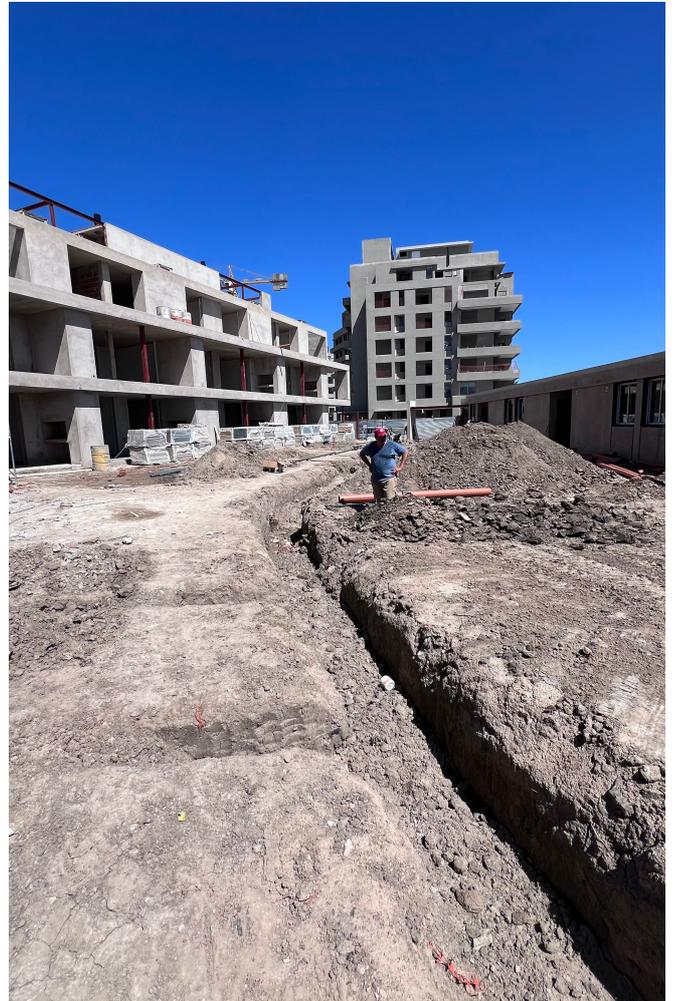

Imágenes

MODULO C

- Se comenzó a embutir los pluviales en desagües PB hacia jardín central.
- Se realizó tendido eléctrico (tomas e iluminación) en parrillas azotea
- Se completa la colada de las carpetas en las 6 UF y comienzan a realizar el raspado.
- Se comienza con el revoque fino en fachada del contrafrente.
- Se completa la elevación de mampostería que cubre los tanques (vista contrafrente) y revoque de mampostería sector tanques de agua, fachada hacia MOD D.
- Se montan las 2 escaleras de terraza UF 201 y 206.



MODULO D

- No hubo avances.



Imágenes




MODULO E

- Se colocan los embudos pluviales en desagües PB hacia jardín central y jardines privados.
- Se continúa la elevación de muros internos.
- Se comienza a realizar el desencofrado de losa en PB y se continúa el tendido de tirantes y puntales para realizar encofrado.
- Avanza el cierre exterior de viga perimetrales.
- Comienza el montaje de columnas metálicas y su colada de hormigón, colocando 2 de 4.



Imágenes



El pasado 14 de diciembre, invitamos a nuestros compradores, inmobiliarias y equipo de Millennia para despedir el año juntos. Los esperamos a todos en el próximo!

milennia.

Reporte mensual de avance de obra.
