



21

# REPORTE MENSUAL

**milennia.** |

AVANCE DE OBRA  
Mayo 2024



## Avance de trabajos de obra




### MODULO A

- Revoques en cuartos de tableros de servicios.
- Completa el recuadro de canaletas, armado de parrillas, carga de carpeta + fratachado sobre losa de parrilla.
- Revoques de parrillas.
- Banquina impermeabilización sector colector.
- Cierre de pleno en toilette de la UF 205 y en baños de las UF 202 y 205
- Impermeabilización de balcones de la UF 205 y 206.
- Colocación de revestimiento de pisos en balcones de la UF 205 y 206.

### MODULO B

- Comienza la instalación de aberturas.
- Comienza la carga del contrapiso.
- Muros de carga para apoyo de barandas en patios internos (sector escaleras caracol)

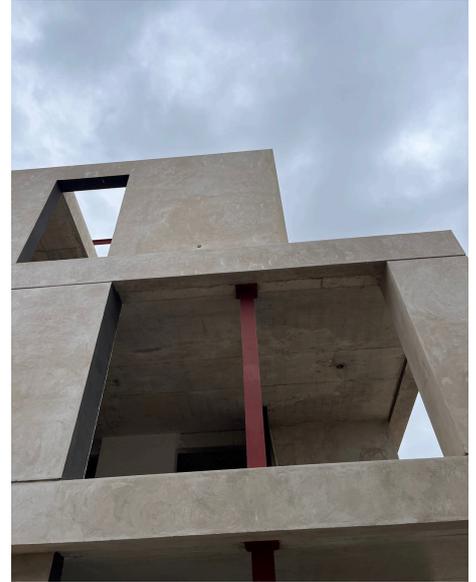

### **.MODULO C**

- Instalación de Aberturas en las 6 UF.

### **MODULO D**



- Sin actividad de gremios de albañilería.

### **MODULO E**

- Revoque exterior fachada hacia modulo C.
- Recuadro de viga perimetral sobre planta baja, sector balcón UF 204.
- Completa la impermeabilización de platea en las 4 UF.
- Revoque exterior fachada hacia modulo C
- Se realiza la carga de las carpetas en las 4 UF. 2º PISO.
- Se continua el tendido de cañeros de provisión de agua fría y caliente en baños y cocinas de las UF 302 y 304.
- Se continúa la elevación de mampostería de tabiques bajo mesadas

de barras de parrillas.

- Realiza la colada de hormigón de las mesadas de las barras de parrillas.
- Tendido de cañeros, amure de cajas de iluminación faltantes.
- Se completa el entoscado.
- Se ejecuta el suelo cemento en el sector de estacionamiento en los MOD ABCE.
- Se prevé comenzar con la etapa de hormigón pobre.
- Buñas en fachada hacia MOD C.
- Revoque fino en fachada sector medidores hacia MOD C.
- Se realiza el tendido de losas radiantes en las 4 UF.
- Colocación de puntos de nivelación de carpetas interiores en las 4 UF.
- Se continúa el tendido de cañeros de provisión de agua fría y caliente en baños y cocinas de la UF 303.
- Comienza el revoque de mamposterías en toda la azote.

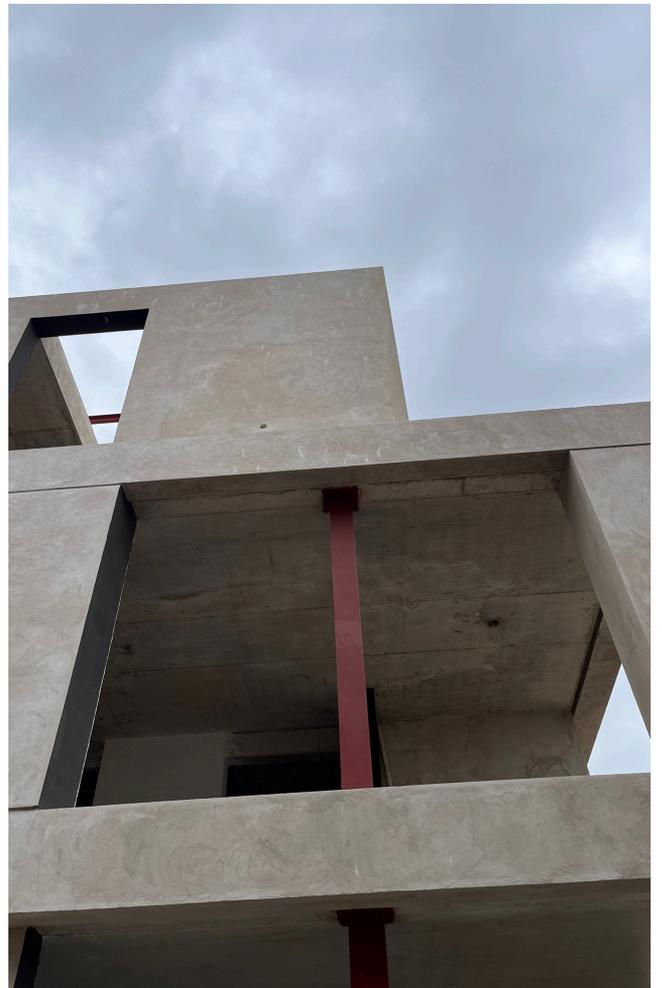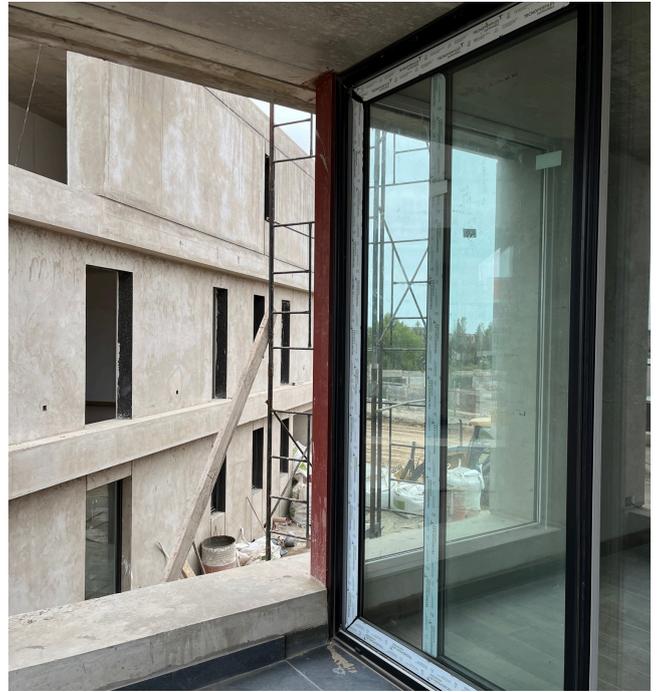



**millennia.**

Reporte mensual de avance de obra.



**SUM**

▪Se termino con la colocación de aberturas y puerta.

