



23

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Julio 2024



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Colocación de revestimientos en escaleras exteriores y guardacanto de acero inox.
- Colocación de alimentación de termotanques de las UF 201 y 206
- Aplicación de fijador y enduido en las UF 201, 202, 203, 204, 205 y 206.
- Armado de soporte de perfiles WPC y chapas translucidas en pérgolas de la UF 201 y 206.

MODULO B

- Revoque en salas de maquinas en ambos Hall de acceso.
- Cableado de la UF 204 y 203
- Revoque de pleno en UF 202
- Colocación de alimentación de termotanques de las UF 201 y 206
- Colocación de revestimientos en ambos accesos de las UF del primer piso.



- Cableado eléctrico de la UF 204 y 203
- Impermeabilización y colocación de revestimientos en balcones de las UF 203, 204 y 205. Armado de soporte de perfiles WPC y chapas translucidas en pérgolas de la UF 201 y 206.

MODULO C

- Finaliza el armado de ambos cuartos de medidores en fachada.
- Colocación de alimentación de termotanques de las UF 201 y 206.
- Inicia la colocación de aberturas en todas las UF de 1er nivel.
- Colocación de revestimiento en baño de la UF 204
- Impermeabilización de box de duchas con membrana cementicia en UF 201.
- Realiza la colada de la carpeta con pendientes de escurrimiento al 100%.
- Realiza babetas y fratachado de carpeta.

- Ajustes medidas de las barras de parrillas para colocación de revestimientos.
- Continúa el armado de colector de tanques.

MODULO D

- Sin actividad de gremios.

MODULO E

- Armado de pleno faltante en UF 102
- Revoque de frentes de parrillas armadas.
- Comienza el armado de estructura de cielorrasos en las 4 UF.
- Armado de pleno en toilette de la UF 201 y Baño de la UF 202.
- Armado de conductos de humos de parrillas, cierres de frentes con mampostería y revoque de las mismas en la UF 204.
- Armado de banquetas en baños y cocinas de las UF 201, 202 y 203.
- Armado de estructura de cielorraso en cocina de la UF 202.
- Revoques en baños y cocinas de las UF 301, 302 y 303
- Tendido de caños de circuitos de iluminación y tomas en UF 304.
- Comienza a trabajar con los revoques de yeso en la UF 302 y fajas en la UF 301.
- Completa la elevación de mamposterías de plenos faltantes y se realiza la colada de hormigón en el remate de los mismos.




SUM y PILETA

- Sin actividad de gremios en SUM.
- Se comenzó con la construcción de la piletta y solárium.

GENERAL

- Se continuo con la realización de la calle interna.

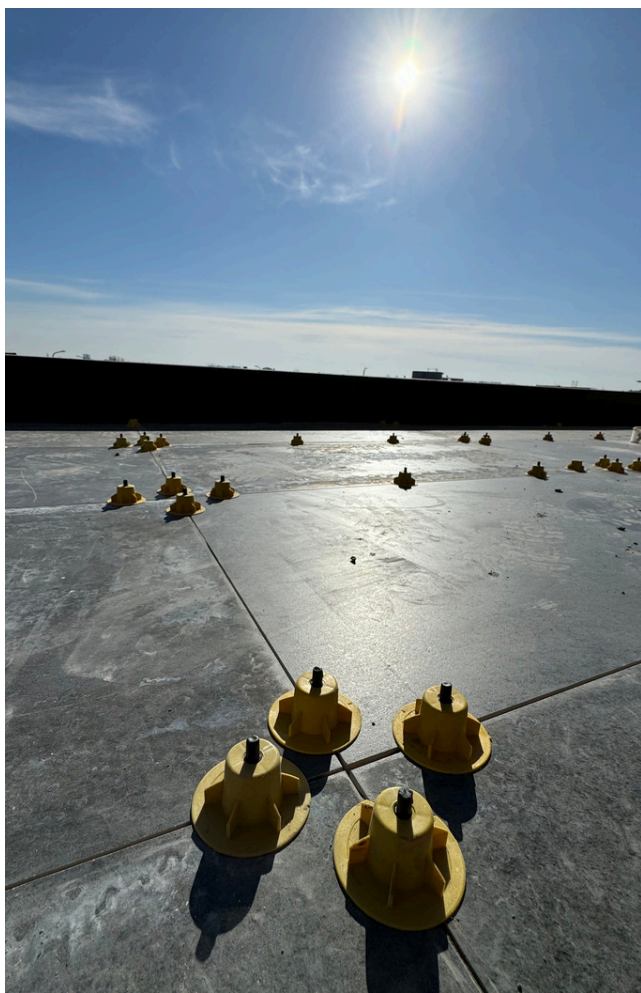



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.
