


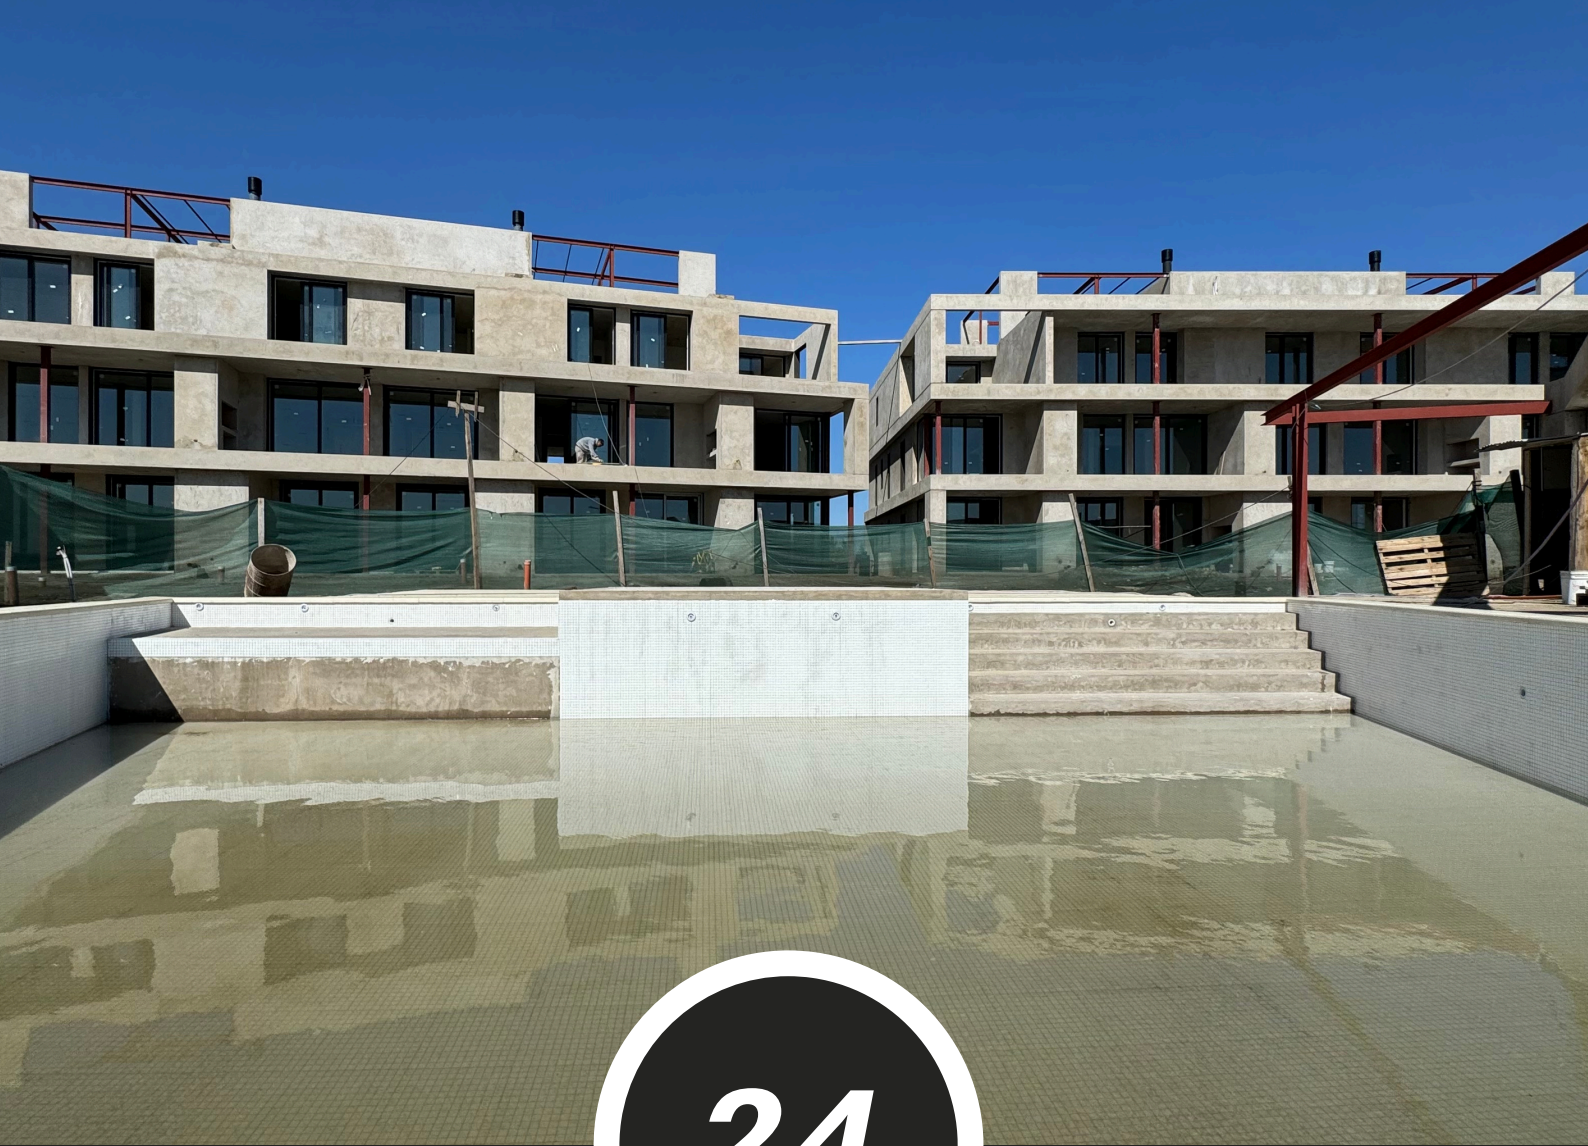


24

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
agosto 2024

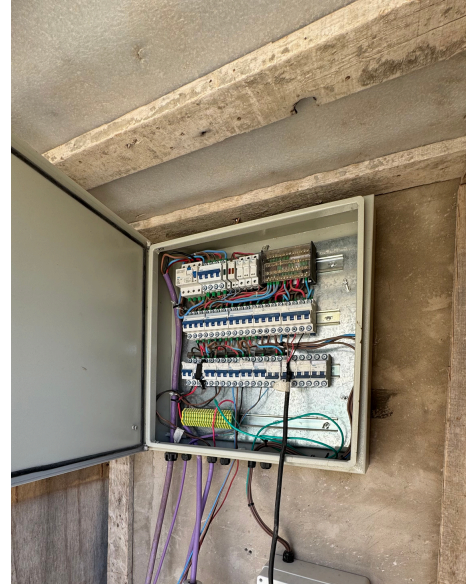

Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Ingresaron pintores, ya se dio segunda mano de pintura en U.F. 102; 103 y 104
 - Se colocaron los extractores en los baños.
 - Se armaron los nichos de medidores en el exterior.
 - Se colocaron terminación de cuarto de caña en las puertas principales.
 - Se ajustaron puertas de acceso de varias U.F.
- Avanzo con el armado de los bidets en baños.
- Se colocaron los marcos y contramarcos en U.F. 201 y 202 2º
 - Armado de cajas y teclas eléctricas en todas las U.F.
 - Se comenzó a aplicar tarquini en azotea.
 - Se colocaron las chimeneas de las parrillas.



MODULO B

- Colocación de ajustes de zócalos en todas las U.F.
- Se comenzo con trabajos de pintura: fijador y enduido en U.F. 106, 201, 202 y 203
- Se aplico la primera mano de pintura en U.F. 102; 103; 104 y 105
- Se realizo limpieza de losas con producto químico en algunas U.F.
- Se aplico segunda mano de pintura a los cielorrasos de baños.
- Se comenzo con los trabajos de membrana en azotea.

MÓDULO C


- Colocación de pisos en todas las U.F. y de ajustes de zocalos.
- Comenzó la colocación de baños en U.F. 202 y 205

MODULO D

- Sin actividad de gremios.

MODULO E

- Realiza la colada de la carpeta de la sala de máquinas bajo escalera.
- Amure de tapas de inspección en acceso de las UF. 16
- Completa el recuadro perimetral de la platea.
- Emplaque de cajones, plenos y cielorrasos en Durlock y se completa el armado de estructuras de cielorrasos pendientes
- Recuadro de canaleta en hall de acceso a las UF y en balcones.
- Revoques exteriores y recuadro de vanos interiores.
- Se realiza la colocación de revestimientos en el baño de la UF 204 y 203
- Se realiza la colocación de revestimiento de pisos en la UF 202 y habitación UF 201.
- Recuadro de escalera
- Armado de mesada en toilette de la UF 304.
- Se completa el revoque con yeso de la UF 304.
- En azotea se completa la colada de la carpeta y el fratachado de la misma.

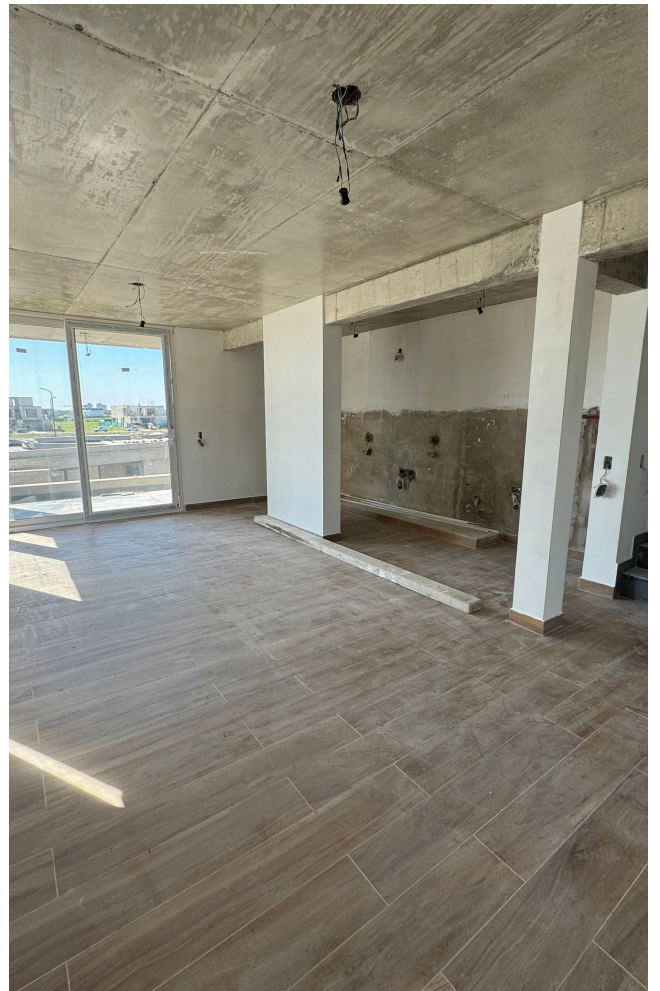



SUM y PILETA

- Sin actividad de gremios en SUM.
- Se continúa la colocación de venecitas y de atérmicos en pileta.

GENERAL

- Continúa trabajando con el armado de la rampa en el MOD E

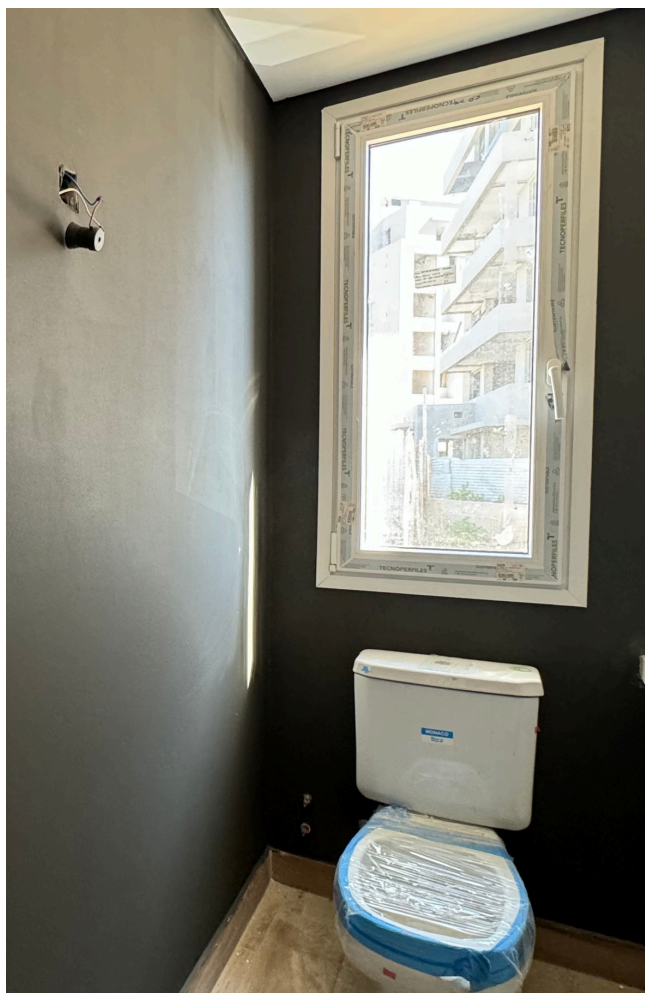

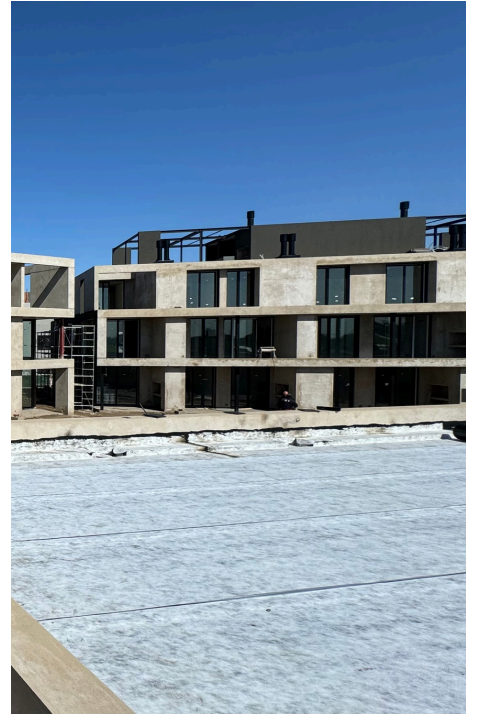

millennia.

Reporte mensual de avance de obra.
