


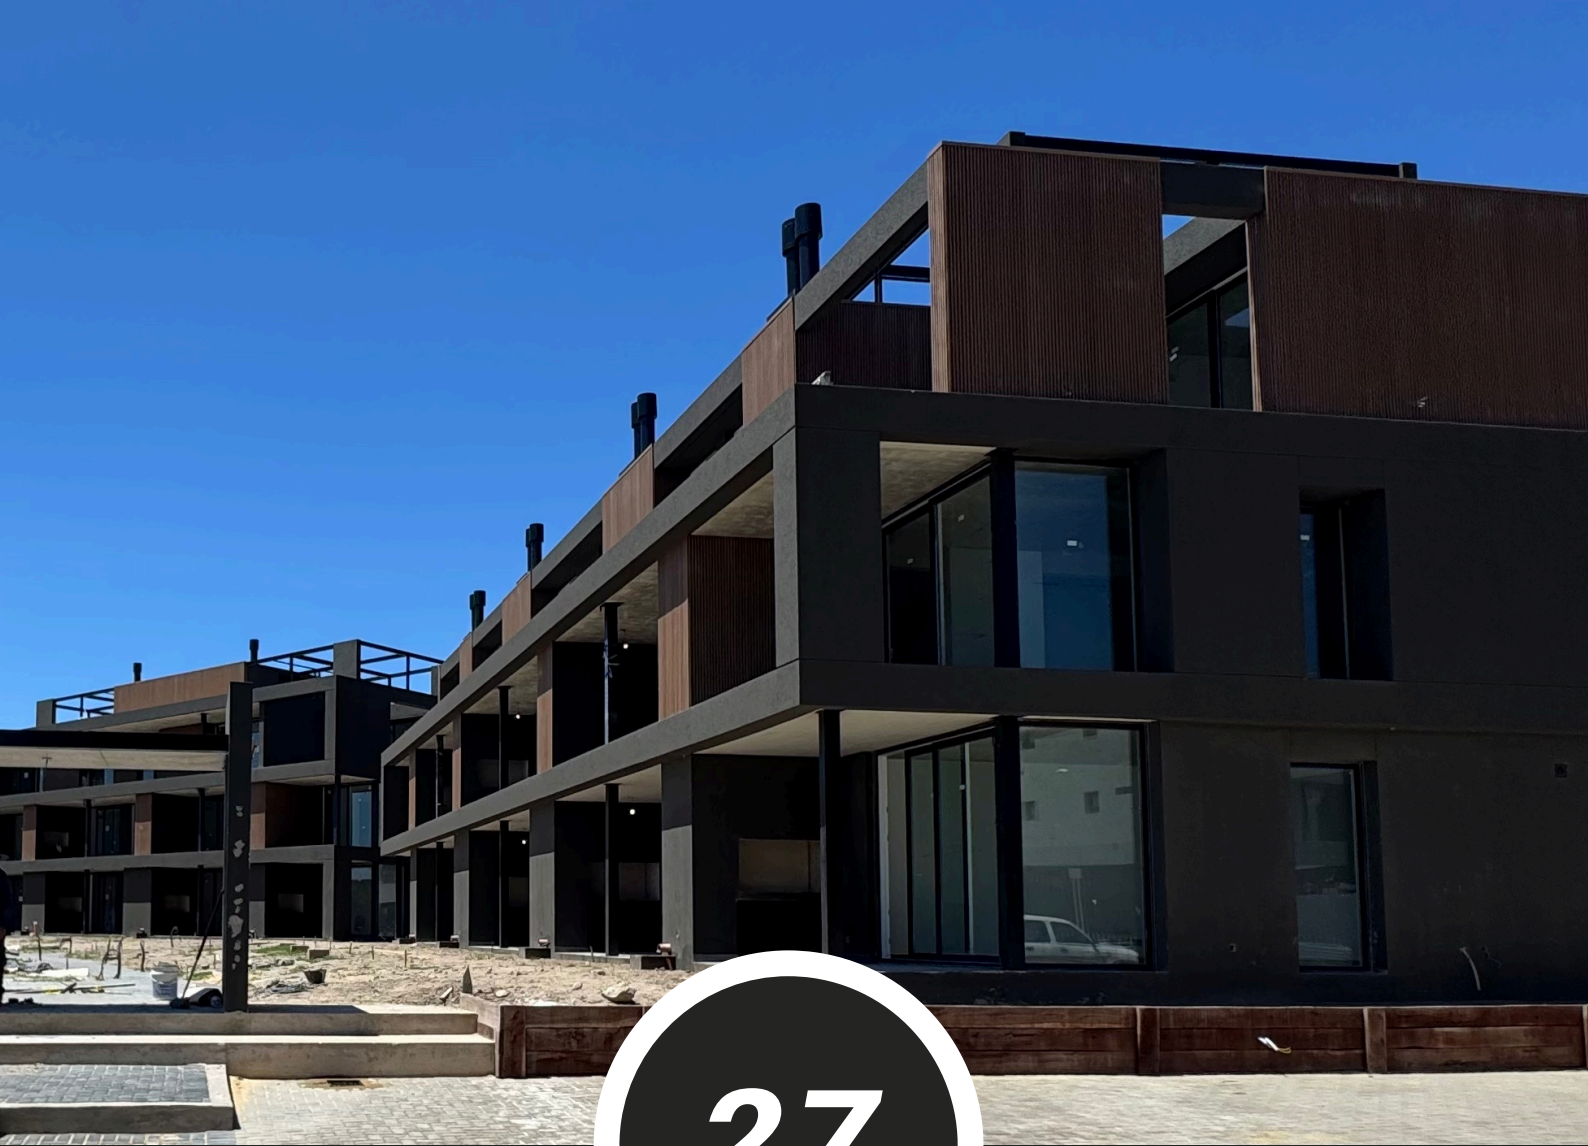

27

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
noviembre 2024



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Se continúa con la colocación de muebles de cocina.
- Terminaciones de alisados de micro cemento de baños y cocinas completos.
- Se terminó con la pintura en UF 201, 202 y 203.
- Colocación de termotanques faltantes en el módulo.
- Se comenzó con la colocación de mesadas en cocinas.



MODULO B

- Se concluyó con la colocación de Bocas de iluminación en cielorrasos de baños y cocinas.
- Instalación de termostatos en UF faltantes..
- Se comenzó con la colocación de muebles de cocina.
- Se comenzó con la colocación de bachas y griferías en baños.
- Se comienza con la colocación de WPC en muros exteriores.

MÓDULO C



- Se terminó con el cableado eléctrico.
- Se comienza con el revoque exterior.
- Se comienza con los trabajos de pintura interior.

MODULO D

- Comienza el armado de muebles de cocina, colocación de griferías y bachas en baños.

MODULO E

- Se termina la colocación de revestimientos de pisos.
- Se concluyó con los retoques de yeso – enlucidos en cocinas.
- Se colocaron puertas de acceso a UF.

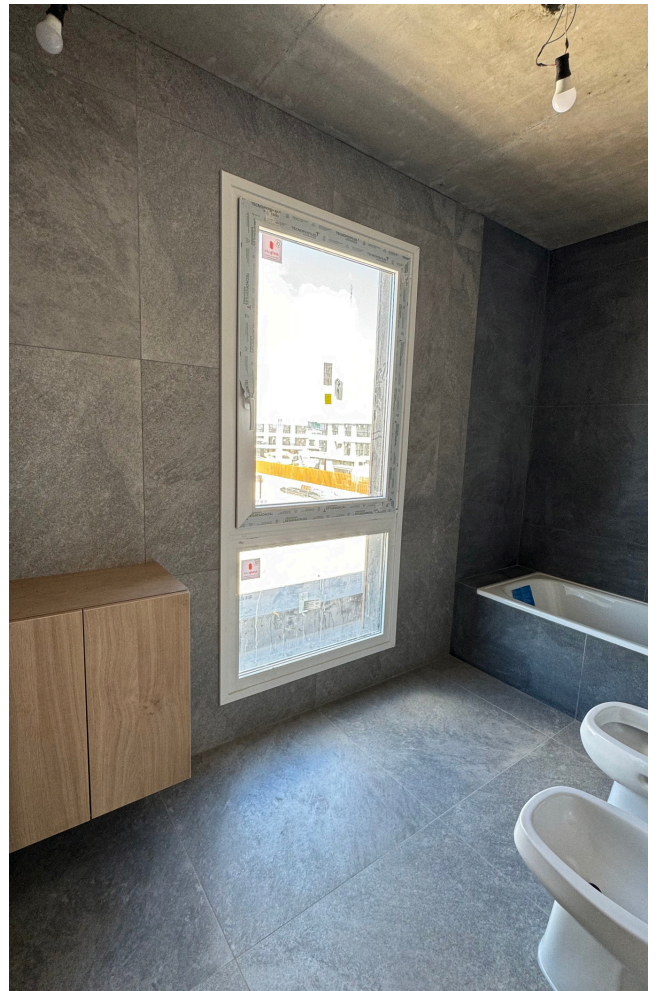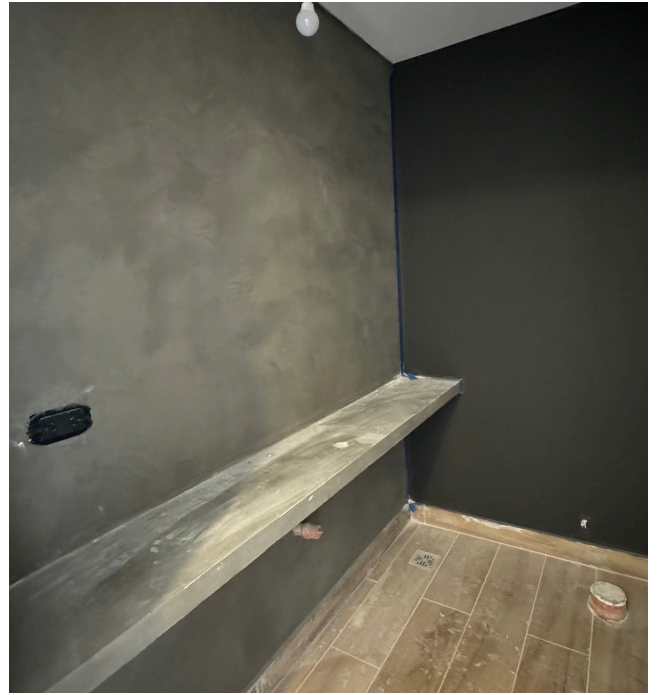

SUM y PILETA

- Sin actividad de gremios en SUM.
- Se comenzó con Piletero para mantenimiento de la piscina.

GENERAL

- Caminos peatonales y cocheras terminadas.
- Se iniciaron los trabajos de parquizacion en áreas comunes.





millennia.

Reporte mensual de avance de obra.
