

OBRA QUARTIER del BAJO



Informe de estado de avance


Octubre 2020



1. Resumen de estado de obra

1.1. Avance de trabajos

Se grafica a continuación el avance de los trabajos hasta el 30 de septiembre.

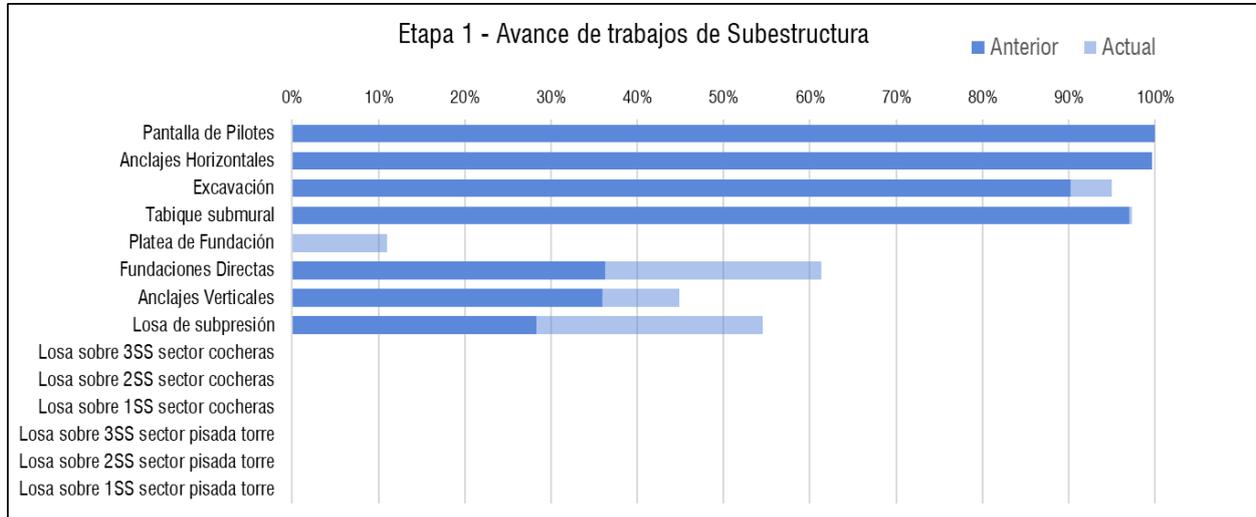


COSUD ha logrado avanzar con la excavación por encima del 90% lo que permite trabajar prácticamente en todo el sector dedicado a la etapa 1.

Durante el mes de octubre se ha avanzado con:

- 40% de la losa sobre el 3SS del sector de cocheras
- 30% del hormigón de la platea de fundación de la torre 1

1.2. Curva de avance

Se detalla en el gráfico a continuación la curva de avance contractual en comparación con la real y la nueva curva supuesta de acuerdo con el impacto de COVID.

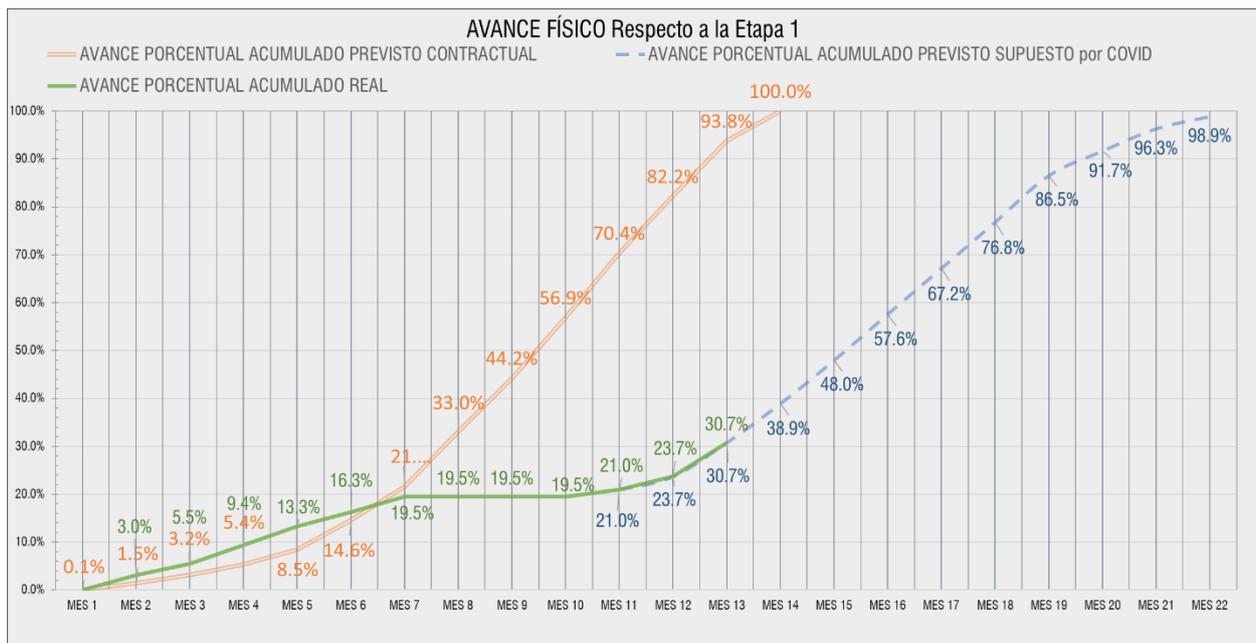


2. Imágenes



Vista desde sector de obradores hacia excavación. Se observa hormigonada parte de la losa sobre el 3SS y están realizando encofrados de parte de la losa sobre el 2SS.



Vista de la platea de fundación de la torre. Están llenando el segundo nivel del sector central del lado México.

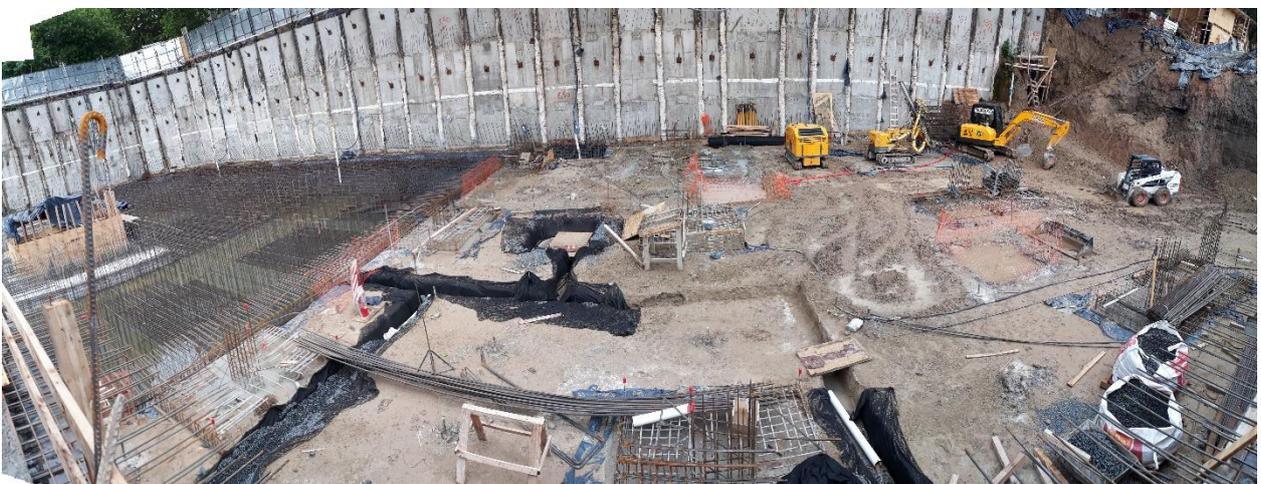

Vista desde la losa sobre el 3SS (del lado de Huergo) de la mitad del terreno sobre el lado de la calle Azopardo.



Vista desde la esquina de Huergo y México hacia Azopardo y Venezuela.



Vista desde México hacia los subsuelos
