



QUARTIER
MADERO URBANO

Asamblea Fiduciantes 02-12-2013


ANALISIS AVANCE DE OBRA

QUARTIER
MADERO URBANO



ESTRUCTURA SOSTEN DE CASONAS A PRESERVAR

QUARTIER
MADERO URBANO

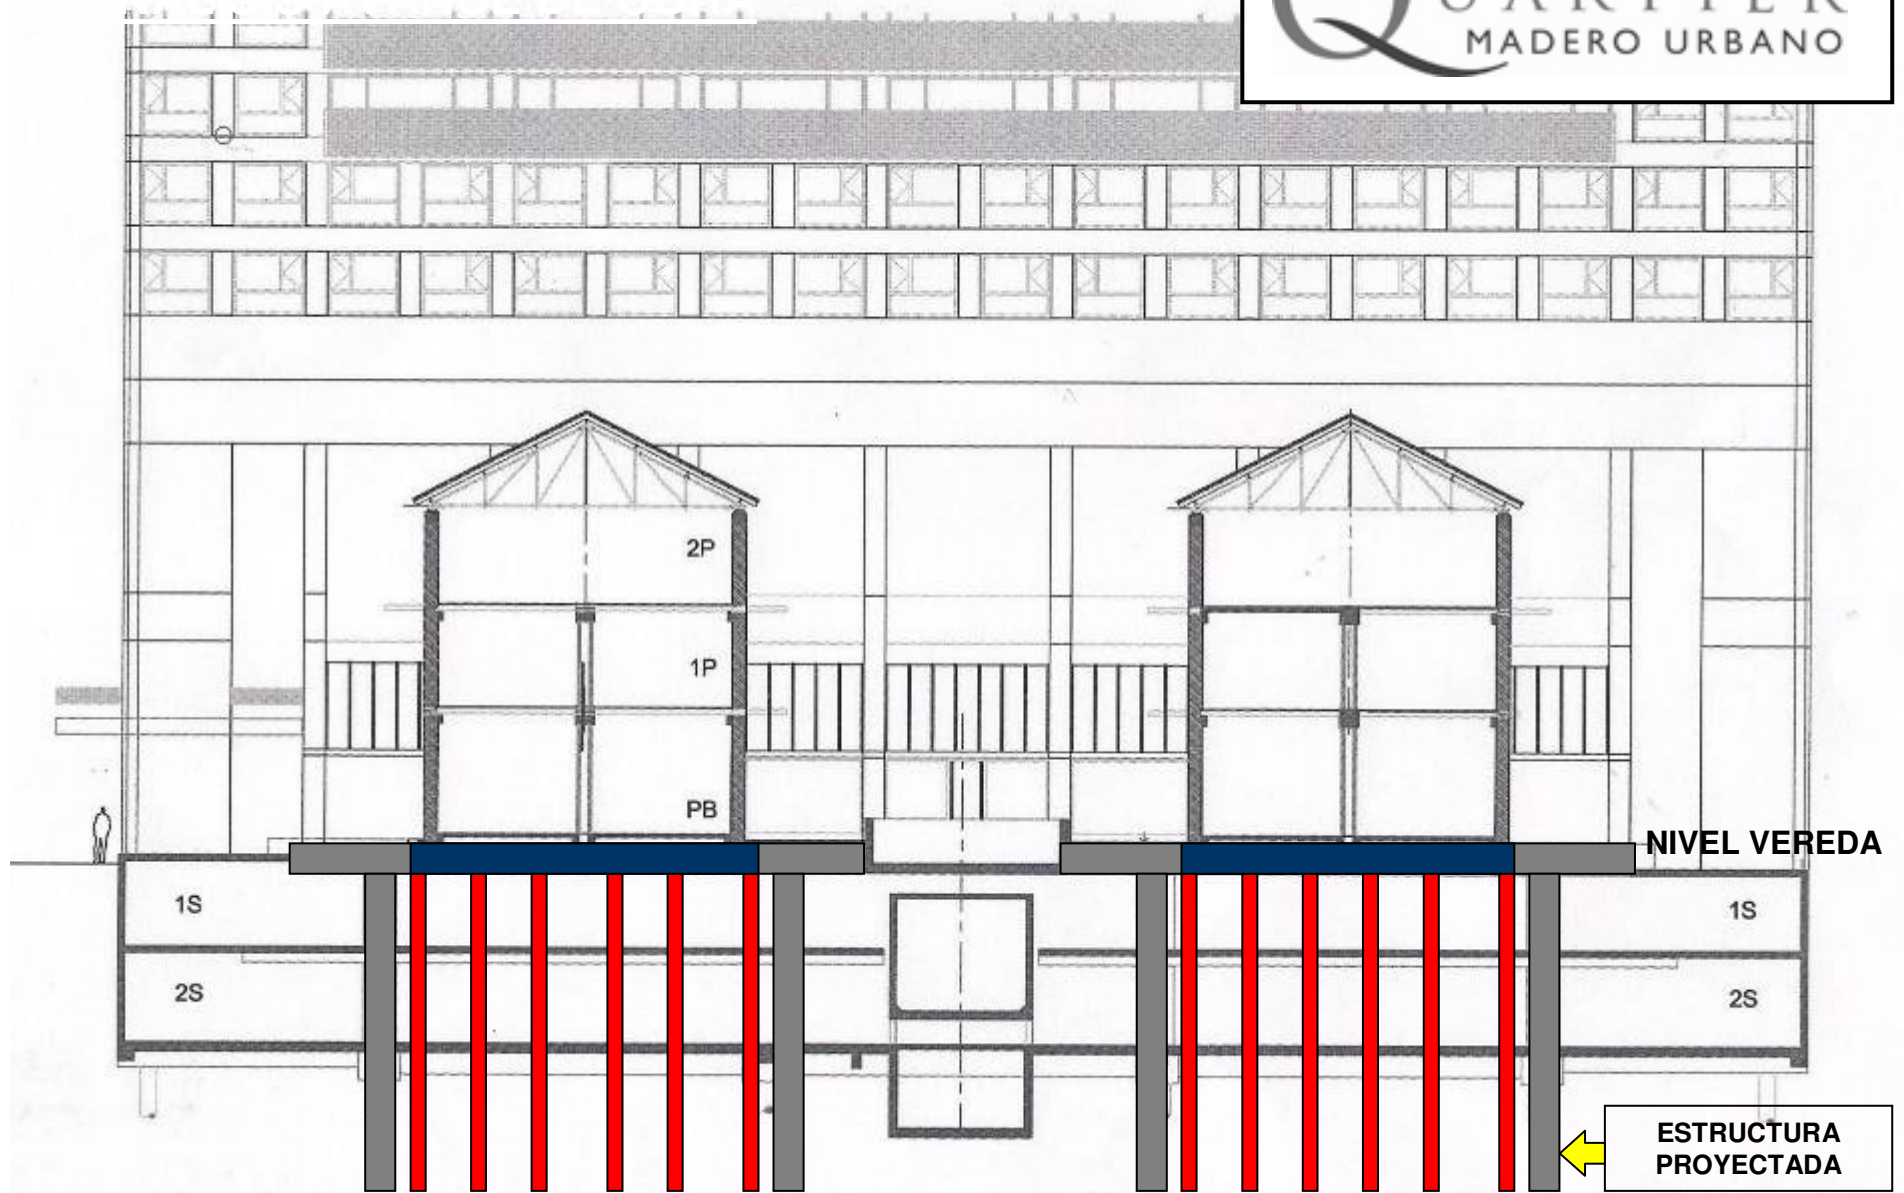

VIGAS DE ENCADENADO Y PILOTES 30X30 EXISTENTES

PILOTES 30X30
EXISTENTES - CORTADOS


PILOTES 30X30
EXISTENTES



QUARTIER
MADERO URBANO

**ESTRUCTURA
PROYECTADA**

**PILOTES 30X30
EXISTENTES**

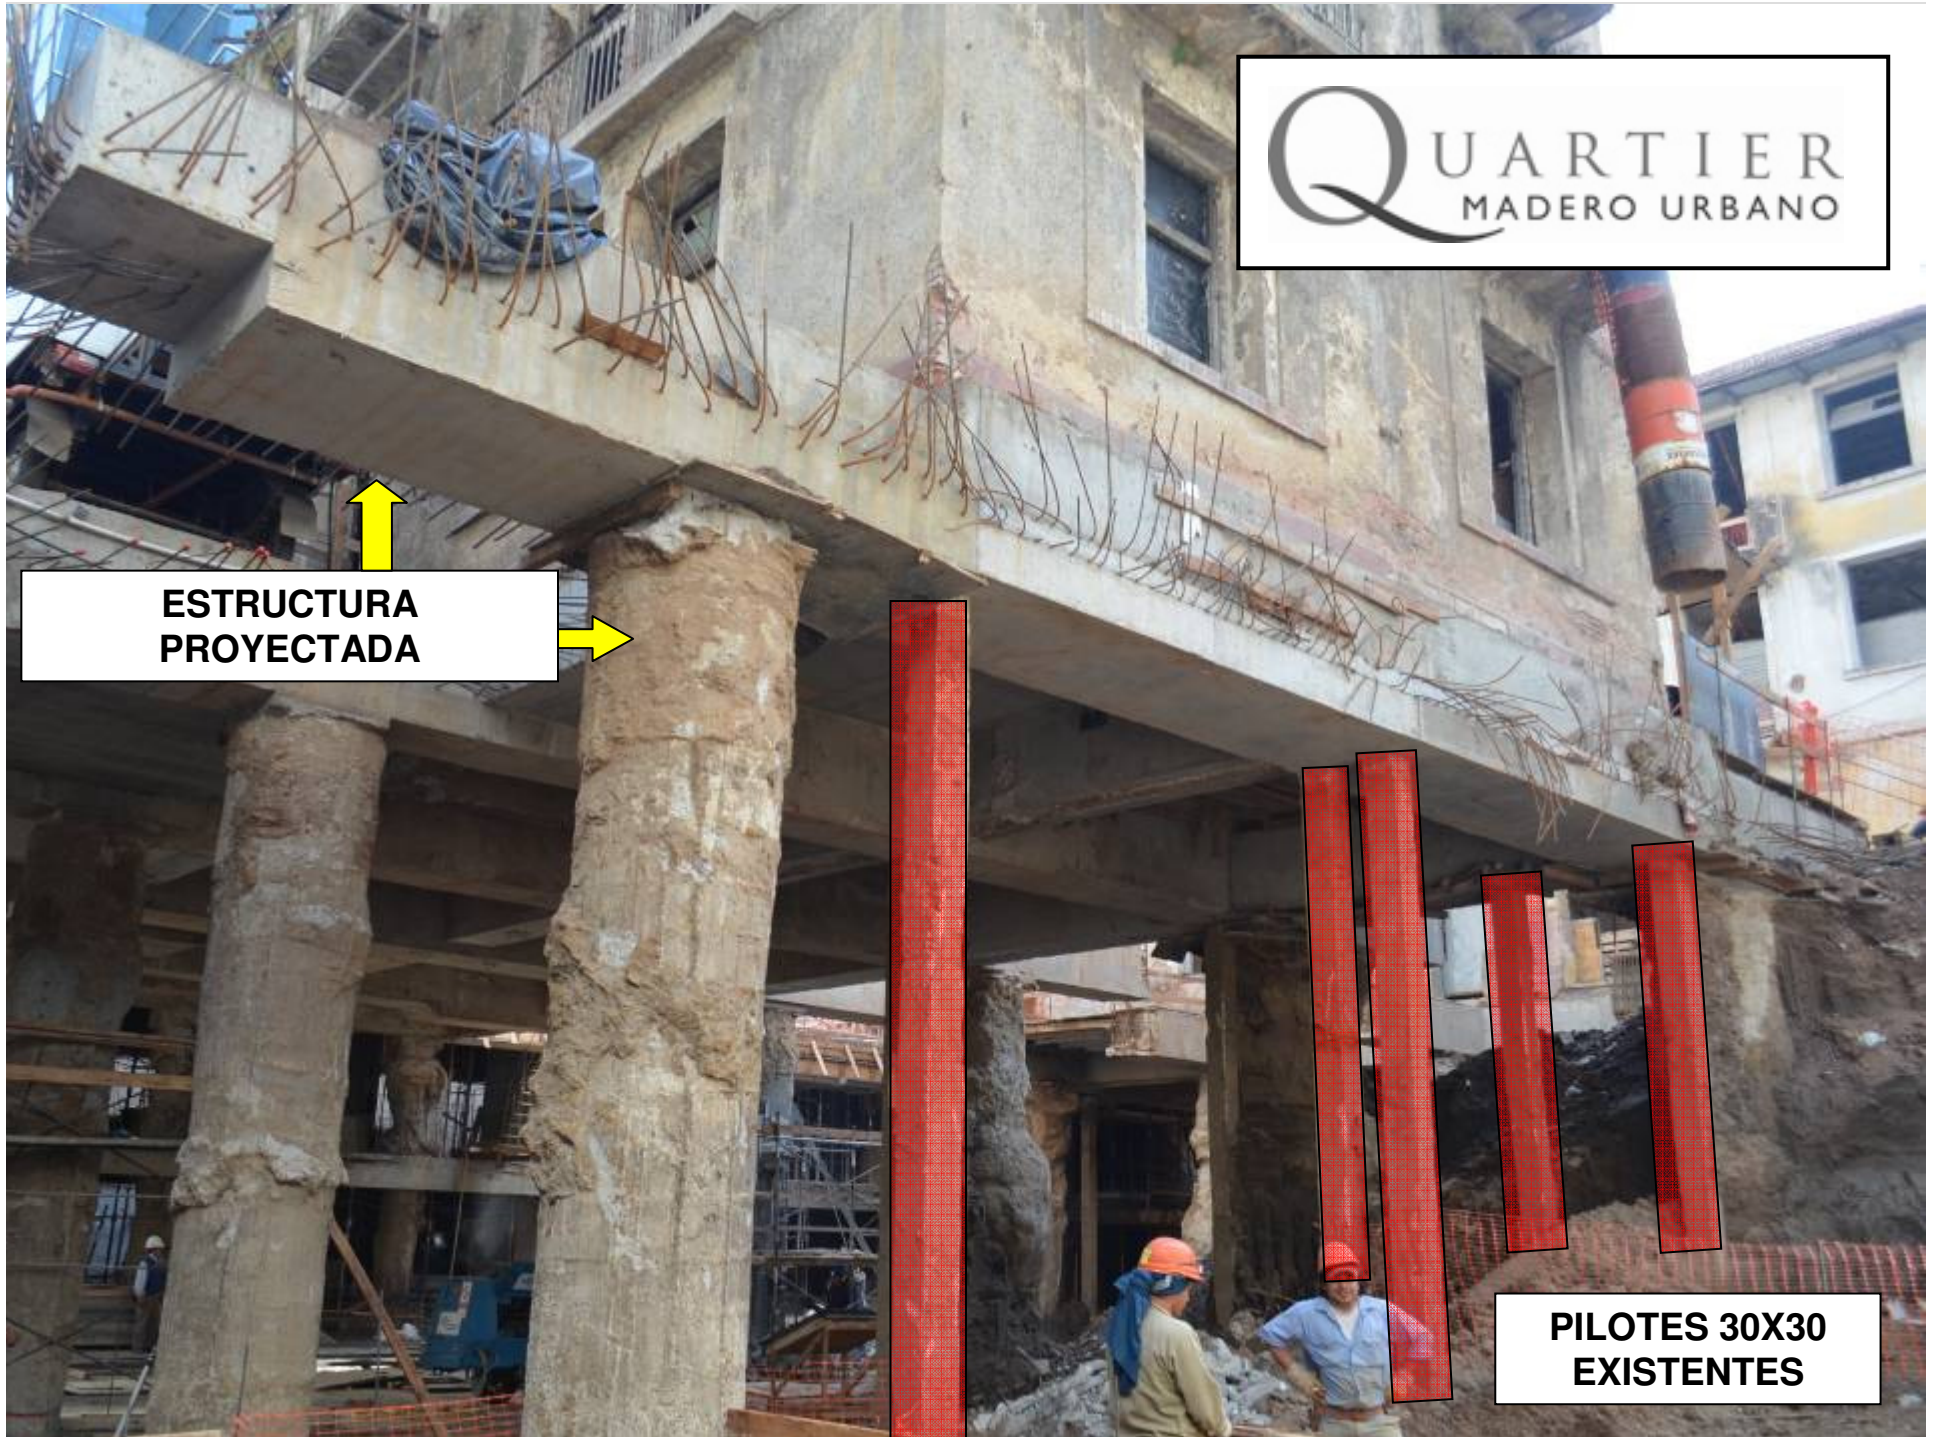


PROCESO DE APUNTALAMIENTO Y HORMIGONADO

QUARTIER
MADERO URBANO




AVANCE DE OBRA – HORMIGON ARMADO

QUARTIER
MADERO URBANO

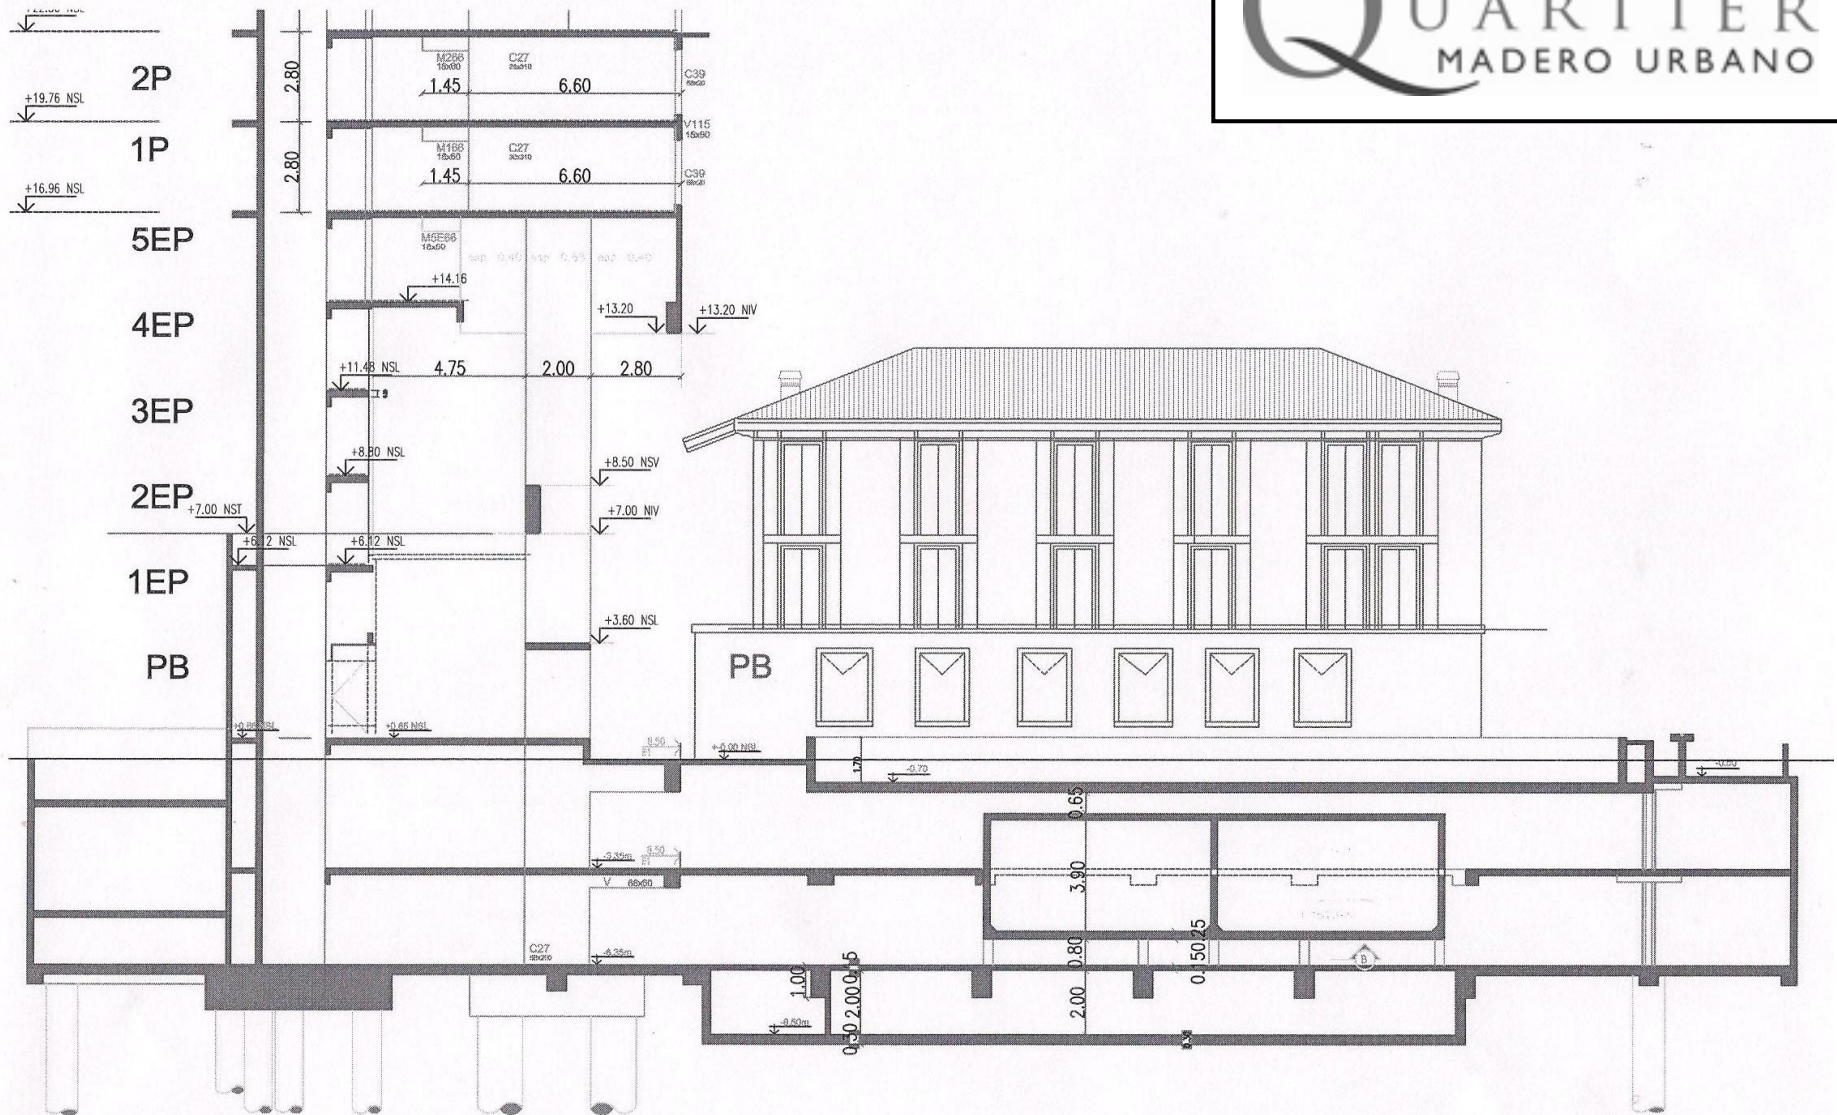


AVANCE DE OBRA – HORMIGON ARMADO

QUARTIER
MADERO URBANO

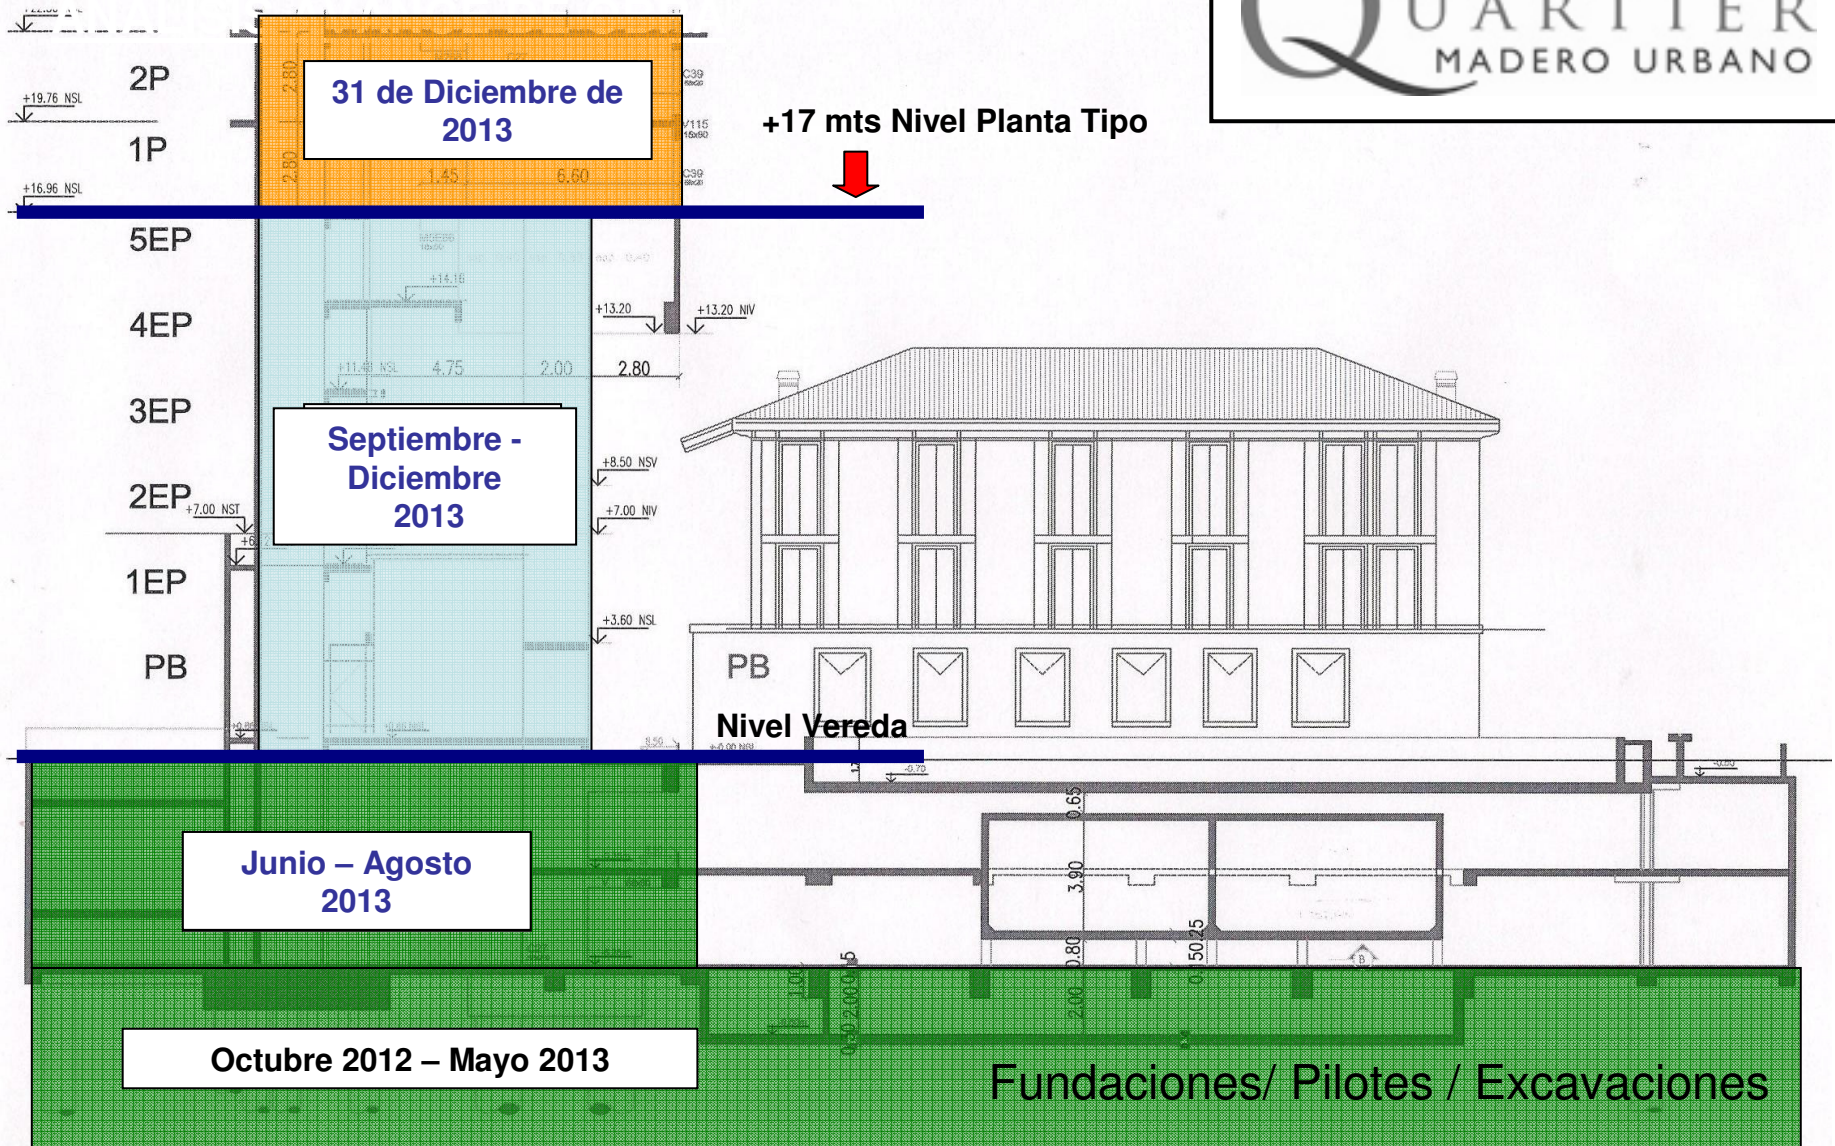

ANALISIS AVANCE DE HORMIGON ARMADO

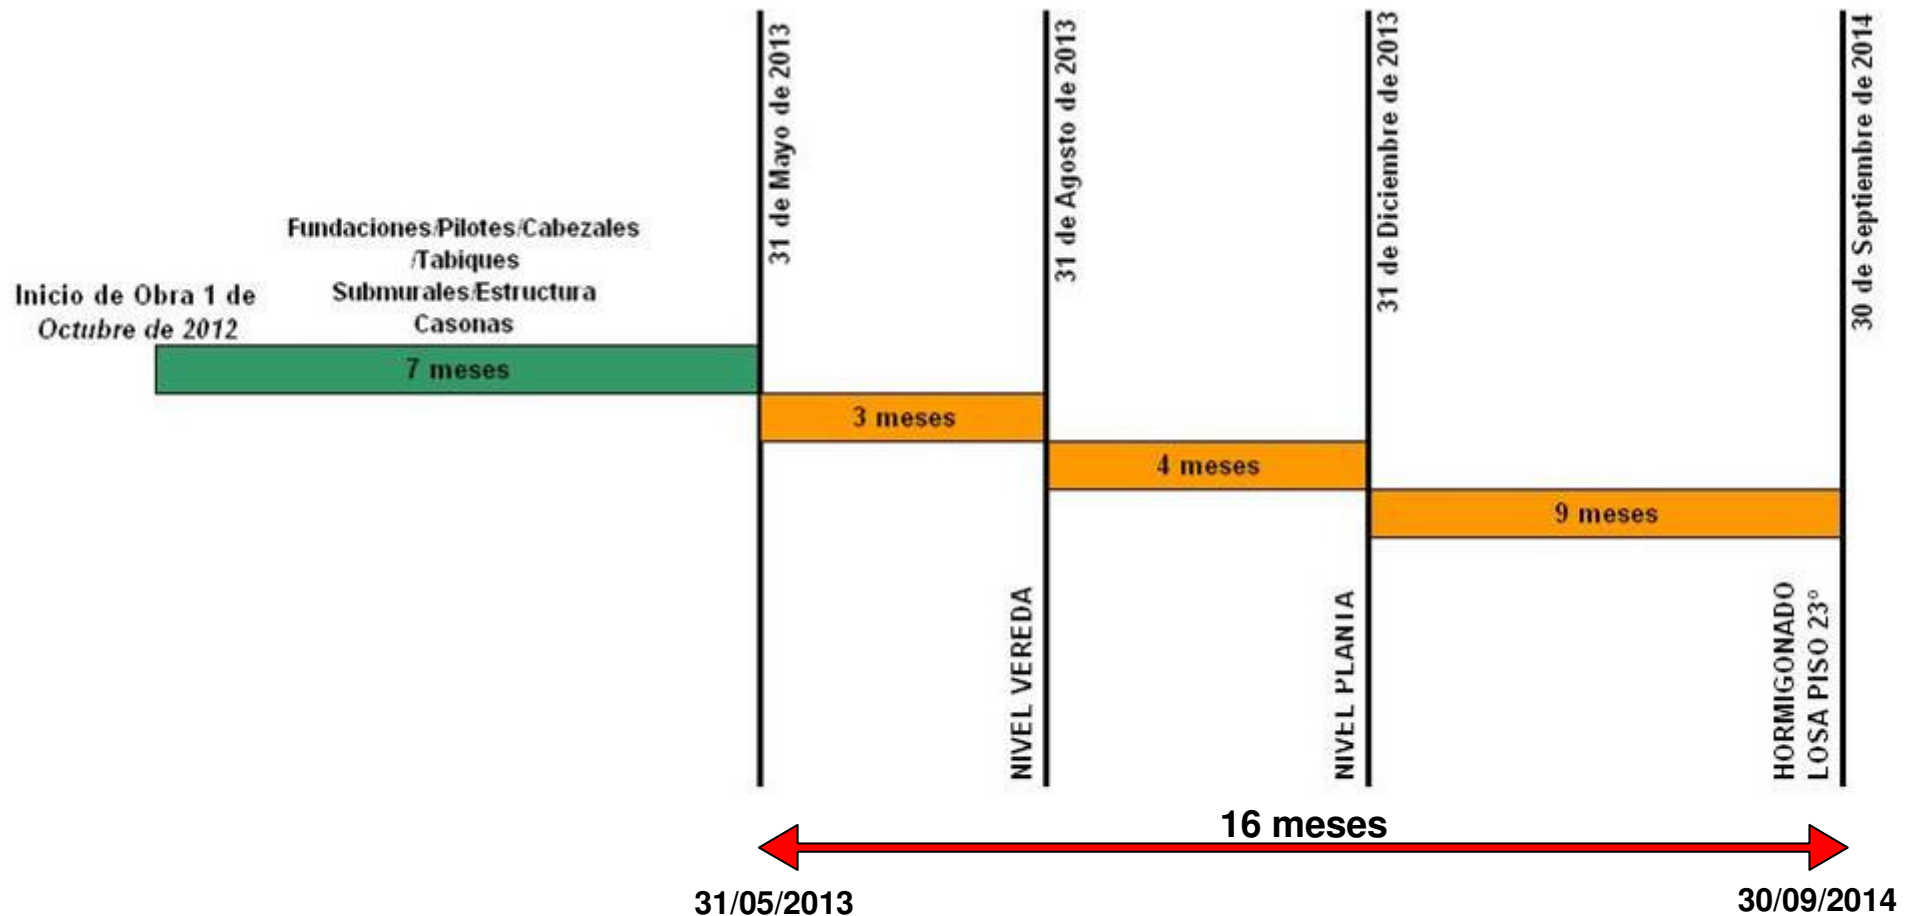

An aerial photograph of a city street scene. In the center, a multi-story building is under construction, with its steel framework visible. To the right, a modern glass skyscraper stands prominently. The street is lined with trees and other urban buildings. A yellow construction crane is visible in the background. The overall scene depicts an urban development project.

QUARTIER
MADERO URBANO

The logo for Argencons, featuring a stylized geometric design of three vertical lines of varying heights forming a triangular shape.

ARGENCONS

QUARTIER

MADERO URBANO



ANALISIS AVANCE DE HORMIGON ARMADO

=

30 de Septiembre 2014

QUARTIER
MADERO URBANO

31 de diciembre de 2013

31 de Agosto de 2013



ANALISIS AVANCE DE OBRA



Fecha de Finalización Contractual de Obra

01/12/2014

Fecha de Finalización al 30 de abril de 2013

01/03/2015

Fecha de Finalización

16/04/2015

info. al 30 de Octubre del 2013

Prorroga por: Lluvias, Pilotes encontrados en las fundaciones de Casonas, Actos Políticos, Paros, Feriados Puente

CONTRATACIONES DE OBRA AL 30/10/2013



CONTRATADO

- HORMIGON ELABORADO
- ACERO
- PILOTAJE
- CONTRATISTA SANITARIO
- CARPINTERIA DE ALUMINIO
- GRIFERIAS
- PISOS Y REVESTIMIENTOS
- TERMOTANQUES
- ASCENSORES
- AIRE ACONDICIONADO
- CONTRATISTA ELECTRICO
- CARPINTERIA DE MADERA
- DVH –TERMOPANELES
- HERRERIA
- ARTEFACTOS SANITARIOS

EN PROCESO DE CONTRATACION

- MUEBLES DE COCINA
- ANAFES
- HERRAJES
