



LOS CARDOS

PILAR

AVANCE DE OBRA - NOVIEMBRE 2021



INVAC SA: Infraestructura Hidráulica, Vial y Sanitaria.

Obras Finalizadas: se ha finalizado la conformación de los reservorios hidráulicos.

Obras en curso: Tendido de conductos de la red cloacal e hidráulica. Relleno de los sectores bajo cota de proyecto.

Obras por comenzar: tendido de la ampliación de la red externa de agua (obra solicitada por Aysa) y tendido de cañerías de agua.





HIDRÁULICA NORTE SA: Red eléctrica y corrientes débiles.

Obras en curso: construcción de dos subestaciones internas al barrio.

Construcción de pilares en lotes. Tendido de canalización perimetral de seguridad.

Obras por comenzar: tendido de conductores (cableados).

INSTALMEC: Red de Gas. Obra para iniciarse próximamente.




Próximas Obras a Licitar:

Obra civil e instalaciones edificios sector común: proyecto ejecutivo en curso. Se estima licitar las obras durante el mes de diciembre y comenzar las obras en febrero 2022.



Equipos operativos en obra:

- Excavadora sobre orugas Volvo B210lc
- Excavadora sobre orugas Doosan 140
- Motoniveladora Komatsu Gd 623 A
- Retropala Volvo B160
- Zanjadora

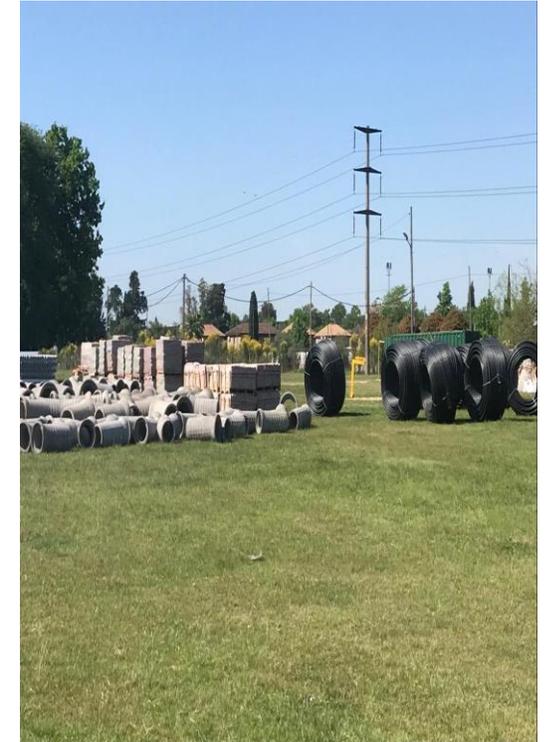



LOS CARDOS
PILAR
