



Avance de obra


QUARTIER

LACROZE

Informe Técnico
Enero 2023

QUARTIER

LACROZE

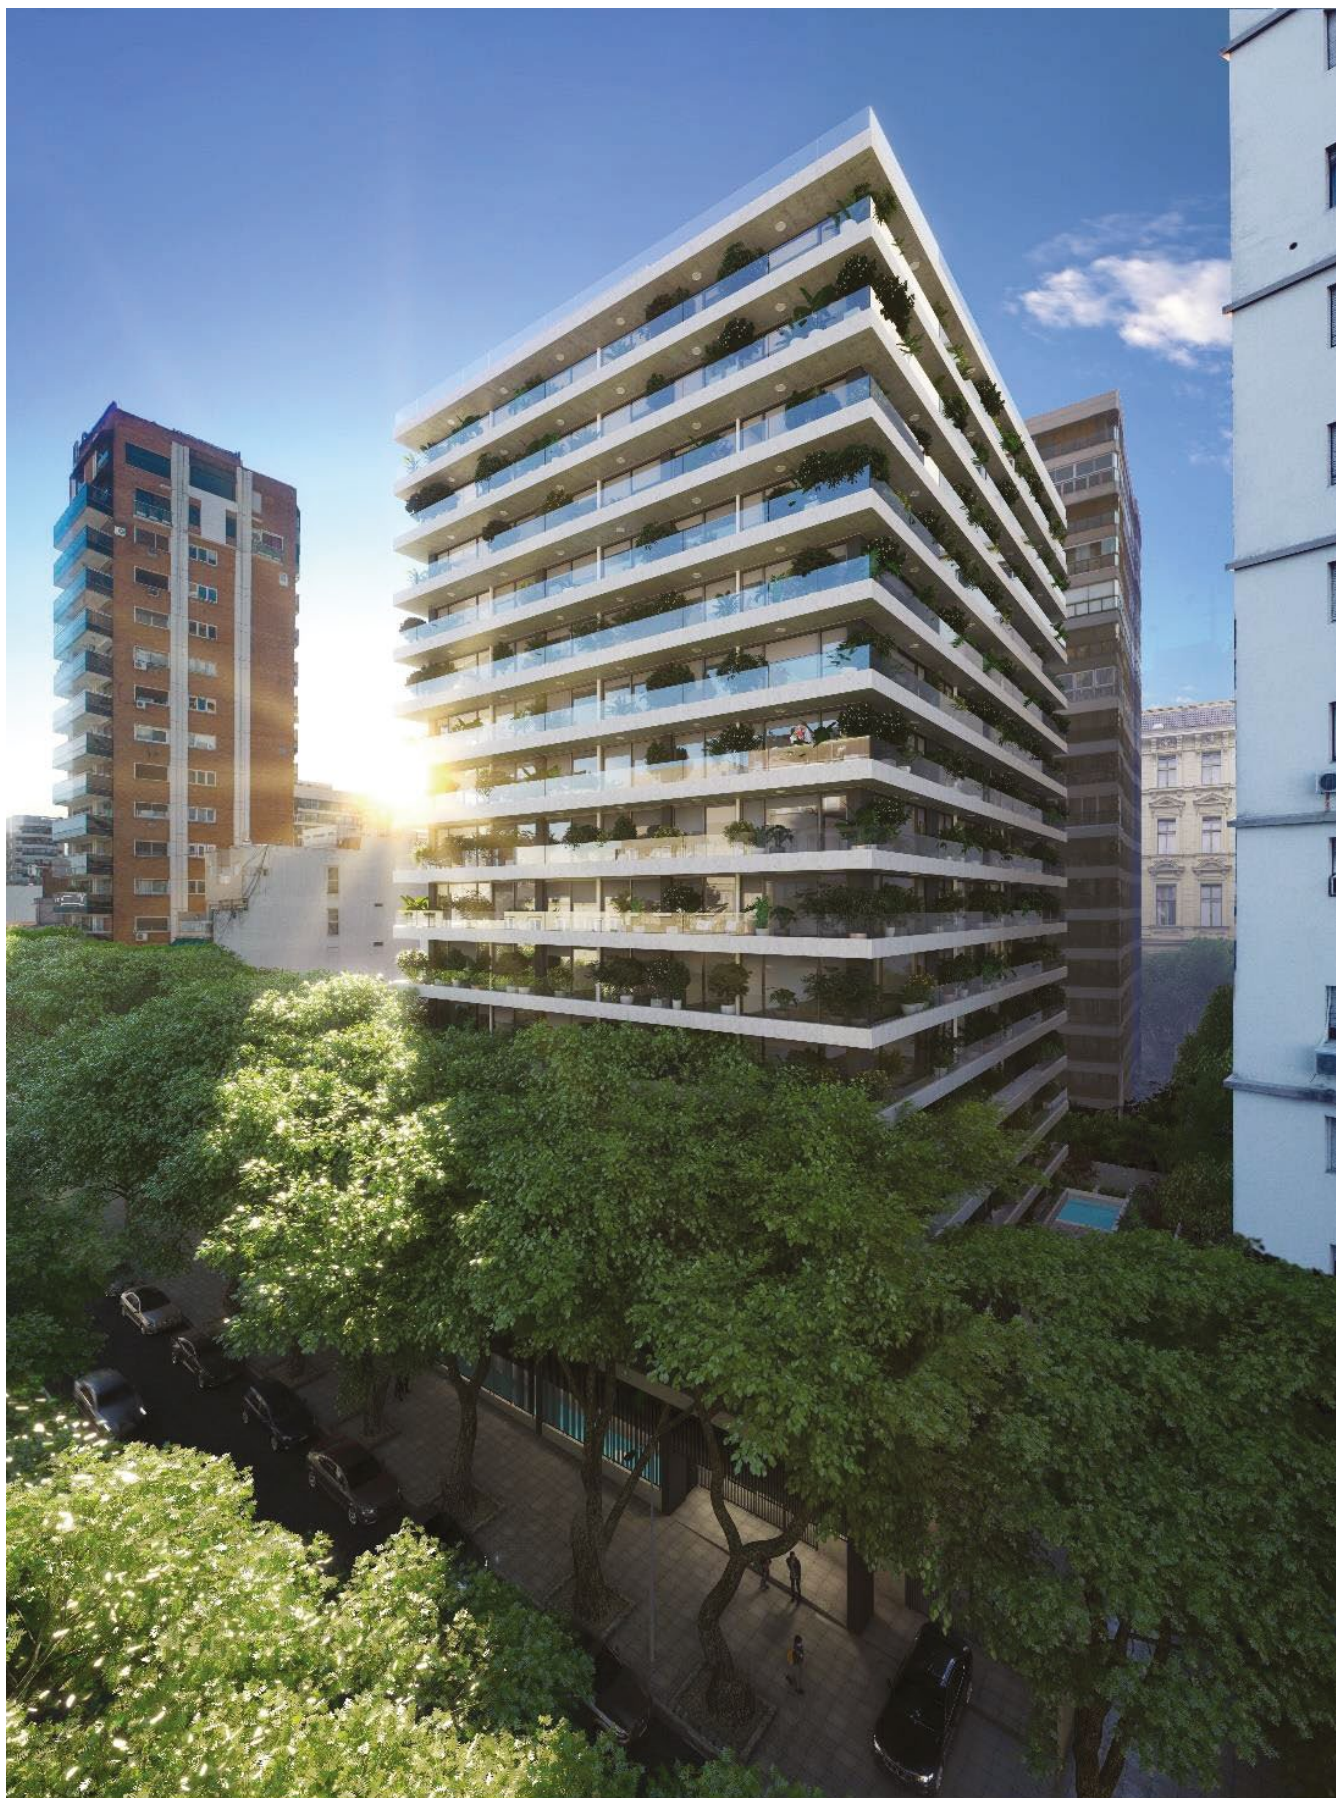

1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBRA

QUARTIER LACROZE

SUPERFICIE DEL TERRENO

1.686 m2

SUPERFICIE DEL PROYECTO

16.192 m2

SUPERFICIE TORRE

12.126 m2 (PB+P1 A P15)

SUPERFICIE SUBSUELOS

4.066 m2 (S1/S2/S3)

FECHA DE INICIO DE OBRA

31/01/2022

PLAZO DE OBRA

24 Meses

2. INTEGRANTES DEL PROYECTO

Comitente:

FIDEICOMISO FEDERICO LACROZE

Desarrolladora

ARGENCONS S.A.

Proyecto

CAMPS & TISCORNIA ARQUITECTOS

Asesores

- Estructuras: Ing. Gerardo Urdampilleta
- Instalaciones Eléctricas: ASELEC
- Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio: Estudio Labonia y Asoc.
- Instalaciones Termomecánicas: GF / Estudio Grinberg

Monitoring de LA DESARROLLADORA

Francisco J. Abelló y Asoc. S.A. (FJA)

Contratista Principal

CONSTRUCTORA CRIBA S.A.

Representante Técnico del Contratista

Ing. Santiago Tarasido

Director de Obra

Ing. Juan Pablo Tarasido

3. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de **Enero 2023** se finalizaron las tareas de ejecución del 70% de las rampas de ingreso vehicular de los Subsuelos, columnas / tabiques / escalera de servicio / losas (incluyendo cañería de la inst eléctrica embutida) de PB (incluyendo pileta exterior), 1er y 2do Piso, finalizando el mes con el avance del encofrado de la losa del 3er Piso.

4. RESUMEN FOTOGRAFICO



QUARTIER

LACROZE

4. RESUMEN FOTOGRÁFICO



QUARTIER

LACROZE



www.quartierlacroze.com

DESARROLLA



Desde 1969 desarrollando *futuro.*
