




19

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Marzo 2024

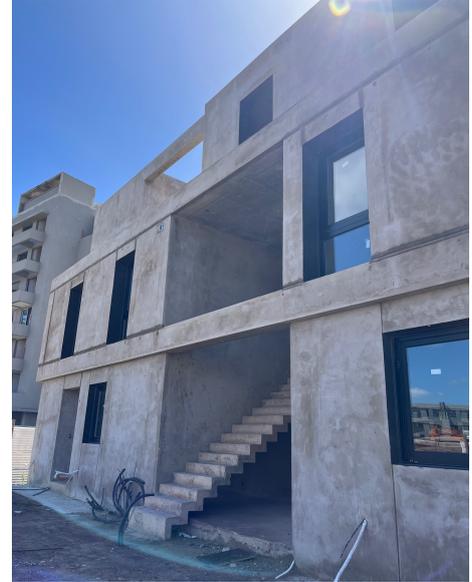

Avance de trabajos de obra

Se continua con la colocación de aberturas




MODULO A

- Se continua con el cableado eléctrico en las unidades 101 a 106
- Se continuo con la colocación de pisos en 2do piso y de revestimiento de paredes.

MODULO B

- Se realizo la aplicación de membrana cementicia para impermeabilización en los balcones de las 6 UF. de 1er piso.
- Colocación de revestimientos en los balcones de las 6 UF de 1er piso.

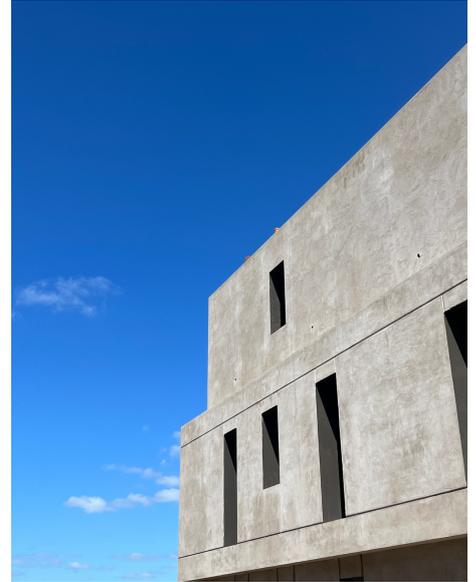

MODULO C

- Colocación de puntos para nivelación de carpeta en ambos hall de entrada.
- Revoques en yeso en UF 201, 202, 203, 204 y 205.
- Realización de las carpetas en balcones de las 6 UF de PB y 1er piso.
- Colocación de caños, cajas de puntos y toma corrientes.
- Realización de carpetas en patios internos de sector escaleras caracol en UF 201/206.
- Revoques en baños UF 201, 204 y 206
- Revoque en cocina UF 204.
- Colocación de circuitos de TV e iluminación en UF de 1er piso y preinstalación de equipos en UF 201, 202, 203, 205 y 206.
- Alimentación de preinstalación de equipos de aire en UF 201, 202, 203, 204, 205 y 206. Se continuo con el yeso en UF 206.

MODULO D


- Sin avances.

MODULO E

- Instalación de caños de provisión de agua fría y caliente en baños de la UF 104, 103.
- Instalación de caño para subida de agua desde tanques de bombeo.
- Revoque y recuadro de viga perimetral sobre planta baja en fachada de frente.
- Revoque fino en fachada contrafrente y trazado de buñas.
- Desagües cloacales en baños y cocinas 203 y 204.
- Amure de cajas de iluminación exterior.
- Revoque grueso en fachada en frente.
- Elevación de mamposterías interiores con ladrillo huecos del 8 y del 12.
- Comienza encofrado de vigas y columnas que conforman la estructura soporte de tanques de agua.
- Se suben 10 tanques de agua, escaleras caracol, los premoldeados de parrillas y perfiles metálicos que conforman pérgola y soporte de tanques de agua.

GENERAL

- Excavación del terreno para trazado de calle interna.

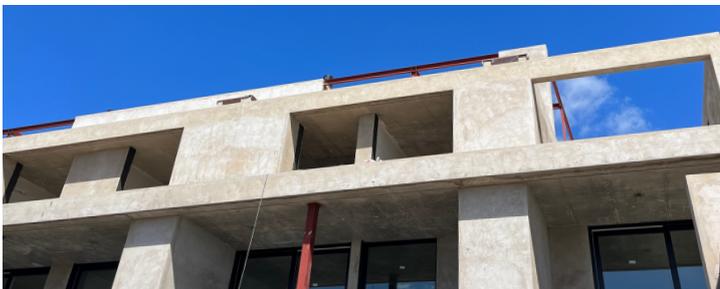



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.
